T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2017

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1

2. GENEL DEĞERLENDİRME 2

2.1. MİSYONUMUZ 2

2.2. VİZYONUMUZ 2

2.3. DEĞERLERİMİZ 2

2.4. İLKELERİMİZ 3

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 3

2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLAR 6

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 8

2.8. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 16

3. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 19

3.1. DEVAM EDEN PROJELER 20

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 20

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi 21

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 22

3.2. TAMAMLANAN PROJELER 22

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 22

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi 23

3.2.3. Yayın Alımı Projesi 27

3.2.4. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi 28

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 29

5. 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 31

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 65'inci madde ile kurulan Giresun Üniversitesi 2016 yılı itibariyle 30151 öğrencisi, 839 akademik ve 365 idari personeli ile 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 12 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ve 17 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Üniversitemizin 2016 yılındaki yatırım projelerinde yer alan ödenekler de bahsi geçen mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Yatırım projelerinin izlenmesi ve yetkili mercilerce değerlendirilmesi gayesiyle Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlığını taşıyan 25'inci ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof.Dr.Cevdet COŞKUN

Rektör

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.MİSYONUMUZ



Üniversitemizin misyonu, milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; kent, bölge ve ülkede toplumun ufkunu genişletmek, insanlığın ilerleyişine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaktır.

2.2.VİZYONUMUZ



Giresun Üniversitesi'nin vizyonu; bilgi ile güçlendirilmiş kaliteli eğitim veren, ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilen, eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslar arası öneme sahip bilgi limanı olmaktır.

2.3.DEĞERLERİMİZ

- Atatürkçülük
- Yurtseverlik
- Hukukun üstünlüğü
- Bilimsellik
- Katılımcılık
- Toplumsal yararlılık
- Güvenilirlik
- Sorumluluk
- Saydamlık

- Evrensellik
- Araştırmacılık
- Kalite ve verimlilik
- Fırsat eşitliği
- Çevre bilinci
- Hesap verebilirlik
- Özgürlük
- Çağdaşlık

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.4.İLKELERİMİZ

- Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek ve arttırmak
- Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek
- Başarıyı önemsemek
- Gelişime ve yeniliklere açık olmak
- Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek
- Ulusal kimliğe sahip çıkmak ve evrensel değerleri bağdaştırmak
- Kaynakları imkanlar dahilinde verimli şekilde kullanmak
- Adaletli bir yönetm politikası izlemek
- İçinde yaşanılan çevre ve topluma duyarlı olmak
- Kültürel ve ahlaki değerleri korumak

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Hedef 1.1: Akademik atama ve yükseltme kriterlerini düzenlemek

Hedef 1.2: Akademik ve İdari personel sayısın artırmak

Hedef 1.3: Çift anadal ve yandal diploması veren programlarını başlatmak

Hedef 1.4: Lisansüstü programlarının niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmek

Hedef 1.5: Eğitim-istihdam uyumlu programlar açmak

Hedef 1.6: Avrupa Yükseköğretim alanı için Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni (AKTS) tamamlamak

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

Hedef 1.7: Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

Hedef 1.8: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemlerinden yararlanma oranını artırmak

Hedef 1.9: Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamak

Stratejik Amaç 2: Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Hedef 2.1: Öğretim elemanlarının akademik yayınlarını bilişim teknolojileriyle erişilebilir hale getirmek.

Hedef 2.2: Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni akredite etmek.

Hedef 2.3: Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve projeleri desteklemek

Hedef 2.4: Kütüphanedeki bilgi kaynağı sayısını artırmak.

Hedef 2.5: Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlamak.

Stratejik Amaç 3: Fiziki Ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi

Hedef 3.1: Kurumsal gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet binalarını inşa etmek

Hedef 3.2: Fiziki yorgunluk görülen binaları bakım - onarım ve tadilatla güçlendirmek.

Hedef 3.3: Yerleşke alanlarında spor sahaları, kantin, kafeterya, yemekhane ve konferans salonu vb. inşaatları tamamlayarak faaliyete geçmelerini sağlamak.

Hedef 3.4: İhtiyaç duyulan alanların kamulaştırılmasını sağlamak

Hedef 3.5: Eğitim-öğretimi makine teçhizatla donatılmış mekanlarla desteklemek

Hedef 3.6: Mevcut Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (Hastane) binalarının hizmet için ihtiyaç duyduğu bakım onarımını yapmak ve makine-teçhizatla donatmak

Hedef 3.7: Bilişim sistemlerinin alt yapısını tamamlamak, entegre hale getirmek ve e-imzaya geçişi sağlamak.

Hedef 3.8: Üniversite olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini almak.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Stratejik Amaç 4: Uluslararasılaşmayı geliştirmek

Hedef 4.1: Uluslararasılaşmanın kurumsal altyapısını geliştirmek

Hedef 4.2: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının lisans ve lisansüstü düzeyinde artırılması.

Hedef 4.3: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci kalitesini artırmak

Hedef 4.4: Akademik personelin uluslararası akademik faaliyetinin artırılması

Stratejik Amaç 5: Üniversite Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 5.1: Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaşatmaya yönelik bilimsel araştırma yapmak ve etkinlikler düzenlemek

Hedef 5.2: Sağlık konusunda bilgilendirici sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek.

Hedef 5.3: Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

Hedef 5.4: Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak

Hedef 5.5: Toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI

a) Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri

5) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

b)Yasal Dayanaklar

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayılabilir.


Üniversitemiz 2016 yılında bütçe geliri olarak toplam 132.779.000TL tahmin edilmiş, yıl içinde 108.324.218,82 TL gelir elde edilmiştir.

2016 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL)

Açıklama	Planlanan Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Cari Hazine Yardımı	92.431.000,00	69.131.084,00	74,79
Sermaye Hazine Yardımı	31.502.000,00	28.176.993,40	89,45
Özgelir	8.846.000,00	10.877.164,92	122,96
TOPLAM	**132.779.000,00**	**108.185.242,32**	**81,48**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Dağılımı

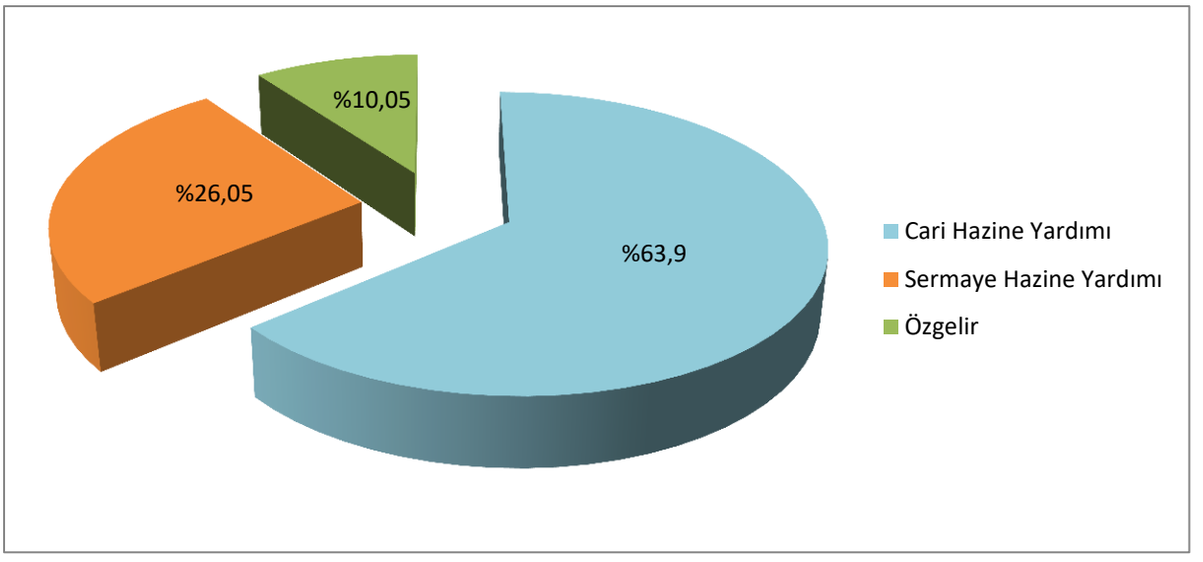

Bununla birlikte Üniversitemizin 2016 yılında bütçe gideri 132.779.000,00 TL olarak öngörülmüş, yıl sonuna kadar 116.491.906,57TL harcama gerçekleşmiştir.

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2016 yıl sonu itibarıyla 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet Konservatuvarı, 12 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ve 17 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Giresun Üniversitesi Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkeleriyle 825.517,07 m^2 arazi yüzölçümü ve 181.583 m^2 yapı alanına sahiptir.



Kale Mevkiinde yer alan Merkez Rektörlük binası bünyesinde Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, Yayın Komisyonu Başkanlığı, Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı, Etik Kurul Başkanlığı, Üniversitelerarası İşbirliği Programı, ADEK, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü, Türk Patent

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi, Mevzuat Komisyonu, Bilgi Edinme Birimi bulunmaktadır.

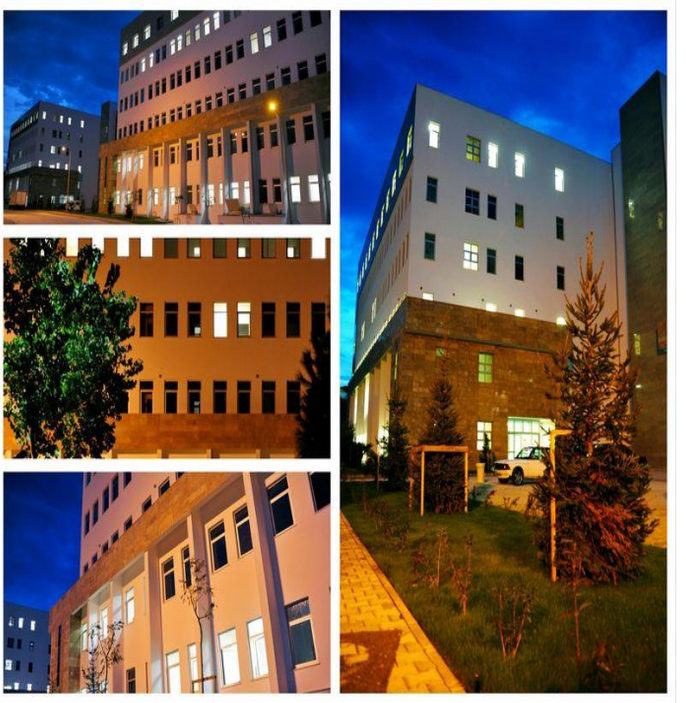

Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Rektörlük Ek Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, bölüm başkanlıkları, engelli öğrenci birimi, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRUMLAB)ile Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi(TÖMER), Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, AB Erasmus Ofisi, AR-Ge Koordinatörlüğü, personel/öğrenci yemekhanesi ile açık spor alanları, merkez kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uygulama oteli(misafirhane), kapalı spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır.

Şehir merkezimizde bulunan bir diğer yerleşkemiz de Nizamiye yerleşkesidir. Yerleşke içinde; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(Hastane), Morfoloji Binası, Mediko-Sosyal Merkezi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Okulumuzun bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.

Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Bulancak, nüfus itibariyle Giresun ilinin en büyük ilçesidir. Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda ağırlıklı olarak Turizm sektörüne yönelik vasıflı eleman yetiştirilmektedir.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Dereli Meslek Yüksekokulu Dereli ilçemizde, Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ilçemizde, Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde, Keşap Meslek Yüksekokulu ise Keşap ilçemizde konumlanmıştır.



Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele ilçesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Piraziz Meslek Yüksekokulu Piraziz ilçesinde yer almaktadır.

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar ilçe merkezinde yer almaktadır. Yerleşke bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır.

Tirebolu İletişim Fakültesi ile Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Bünyelerinde laboratuvarlar, konferans salonları, donanımlı teknoloji sınıfı ve kütüphane mevcuttur.




Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

Mevcut Kapalı Alanların Dağılımı

	TOPLAM KULLANIM ALANI (m^2)
Rektörlük Binası(Şehir)	1809
Nizamiye Ön Blok	4604
Nizamiye Arka Blok	160
Gazipaşa A Blok(Tıp Fakültesi)	2.085
Gazipaşa B Blok	1.474
Gazipaşa C Blok	5.048
Gazipaşa MYO	1.355
Gazipaşa Misafirhane/Uygulama Oteli	820
Gazipaşa Prefabrik(Tıp Fakültesi)	592
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	794
Gazipaşa Mobilya İşlik	230
Güre A-B-C Bloklar	5.360
Güre D-E Bloklar	4.250
Güre F-G-H Bloklar	5.280
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056
Güre Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası	5.912
Güre Isı Merkezi	202
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468
Güre Prefabrik(Spor Bilimleri Fakültesi)	416
Güre Lojmanlar	5.440
Güre Kreş	1.040
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356
Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.950
Espiye MYO(MEB)	3.040
Espiye MYO(SYDV)	3.324
Şebinkarahisar UBYO	3.733
Bulancak UBYO	5.268
Görele UBYO	2.584
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	6.370
Alucra MYO	5.276
Şebinkarahisar MYO(Teknik)	5.270
Şebinkarahisar MYO(Sosyal)	2.720
Şebinkarahisar İşlik	700
Şebinkarahisar Fırın	120
Tirebolu MBMYO	2.600
Eynesil Kamil Nalbant MYO	2.826
Keşap MYO	875
Dereli MYO	3.538
Ahmet Yılmaz Lojmanları	2.094
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848
Sahil SET (Kafeterya)	203
Sahil SET (Rektörlük Konutu)	463
Sahil SET (Havuz)	200
Sahil SET (Apart Evler)	207
Sahil SET (Kreş)	459
Sahil SET (Lojman)	672
Fen-Edebiyat Fak. I.Kısım	44.134
Fen-Edebiyat Fak. II.Kısım	10.755
T O P L A M	**181.583**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

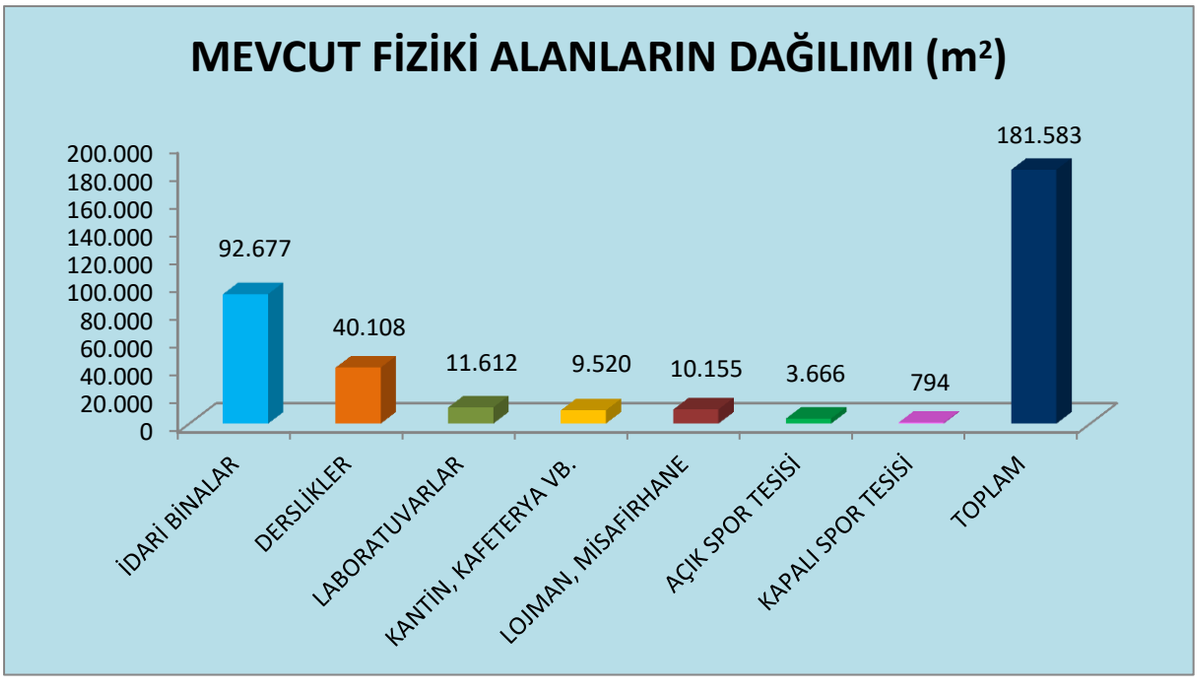

2016 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 832 akademik, 365 idari toplam 1197 personel bulunmaktadır. Üniversitemizde 2016 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

2016 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYILARI			
	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	**Boş**	**Toplam**
Profesör	50	20	70
Doçent	61	20	81
Yrd. Doçent	283	73	356
Öğretim Görevlisi	241	87	328
Okutman	36	42	78
Çevirici	-	2	2
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	-	2	2
Araştırma Görevlisi	150	59	209
Uzman	11	4	15
TOPLAM	**832**	**309**	**1141**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2016 YILI İDARİ PERSONEL SAYILARI					
Sınıflara Göre	**Kadroların Doluluk Oranına Göre**		**Cinsiyete Göre**		**Toplam**
	Dolu	**Boş**	**K**	**E**	
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	250	203	95	155	453
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	44	177	36	8	221
Teknik Hizmetler Sınıfı	48	64	4	44	112
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	1	1	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	1
Yardımcı Hizmetler Snıfı	20	31	0	20	51
TOPLAM	**365**	**477**	**136**	**229**	**842**

İdari personel sayısı içersindeki en büyük payı %68,49 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

2016 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı 30.151'dir. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAKÜLTELER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	-	-	-	-	-
Eğitim Fakültesi	1968	1007	534	216	3725
Fen Edebiyat Fakültesi	515	909	374	336	1619
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	98	54	-	-	152
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	721	697	551	765	2734
İslami İlimler Fakültesi	213	139	124	114	590
Mühendislik Fakültesi	165	327	18	71	581
Sağlık Bilimleri Fakültesi	645	120	-	-	765
Spor Bilimleri Fakültesi	89	201	-	-	290
Tıp Fakültesi	134	145	-	-	279
Tirebolu İletişim Fakültesi	239	322	-	-	561
Turizm Fakültesi	-	-	-	-	-
Devlet Konservatuvarı	54	74			128
TOPLAM	**4841**	**3995**	**1601**	**1502**	**11424**

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	184	183	-	-	367
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	8	4	-	-	12
Sosyal Bilimler Enstitüsü	402	525	20	54	1001
TOPLAM	**594**	**712**	**20**	**54**	**1380**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

YÜKSEKOKULLAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	204	392	42	89	727
Görele Ubyo	245	197	206	183	831
Şebinkarahisar Ubyo	371	80	312	136	899
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	**820**	**669**	**560**	**408**	**2457**

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Alucra Turan Bulutçu Myo	500	377	169	212	1258
Dereli Myo	132	119			251
Espiye Myo	298	362	190	335	1185
Eynesil Kamil Nalbant Myo	405	93	328	18	844
Keşap Myo	128	139	53	28	348
Sağlık Hizmetleri Myo	221	133	123	84	561
Sosyal Bilimler Myo	750	833	395	576	2554
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Myo	608	574	136	203	1521
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Myo	262	782	4	14	1062
Teknik Bilimler Myo	468	1431	183	1161	3243
Tirebolu Mehmet Bayrak Myo	728	818	249	268	2063
TOPLAM	**4500**	**5661**	**1830**	**2899**	**14890**
GENEL TOPLAM	**10755**	**10522**	**4011**	**4863**	**30151**

2.8. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2016 yılı yatırımlarıyla ilgili bütçe tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 31.502.000,00 TL iken, 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8. maddesi uyarınca 4.580.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak Üniversitemiz yıl sonu sermaye ödeneği toplam 36.082.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 9.622.720,68 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğe oranı %26,67'dir.


Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2016 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2016 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2016 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	29.000.000,00	31.580.000,00	8.082.965,99	25,60
Eğitim/Beden Eğitimi Spor	1	2.000,00	2.000,00	-	-
Sağlık	1	2.500.000,00	2.500.000,00	614.741,70	24,59
Kamulaştırma		-	2.000.000,00	925.012,99	46,25
TOPLAM	**7**	**31.502.000,00**	**36.082.000,00**	**9.622.720,68**	**26,67**

2016 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2016 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	7.250.000,00	9.450.000,00	6.007.218,37	63,57
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	580.000,00	550.852,73	94,97
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	-	2.000.000,00	925.012,99	46,25
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.002.000,00	22.002.000,00	1.768.192,65	8,04
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	50.000,00	-	-
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	2.000.000,00	371.443,94	18,57
TOPLAM		**31.502.000,00**	**36.082.000,00**	**9.622.720,68**	**26,67**


Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

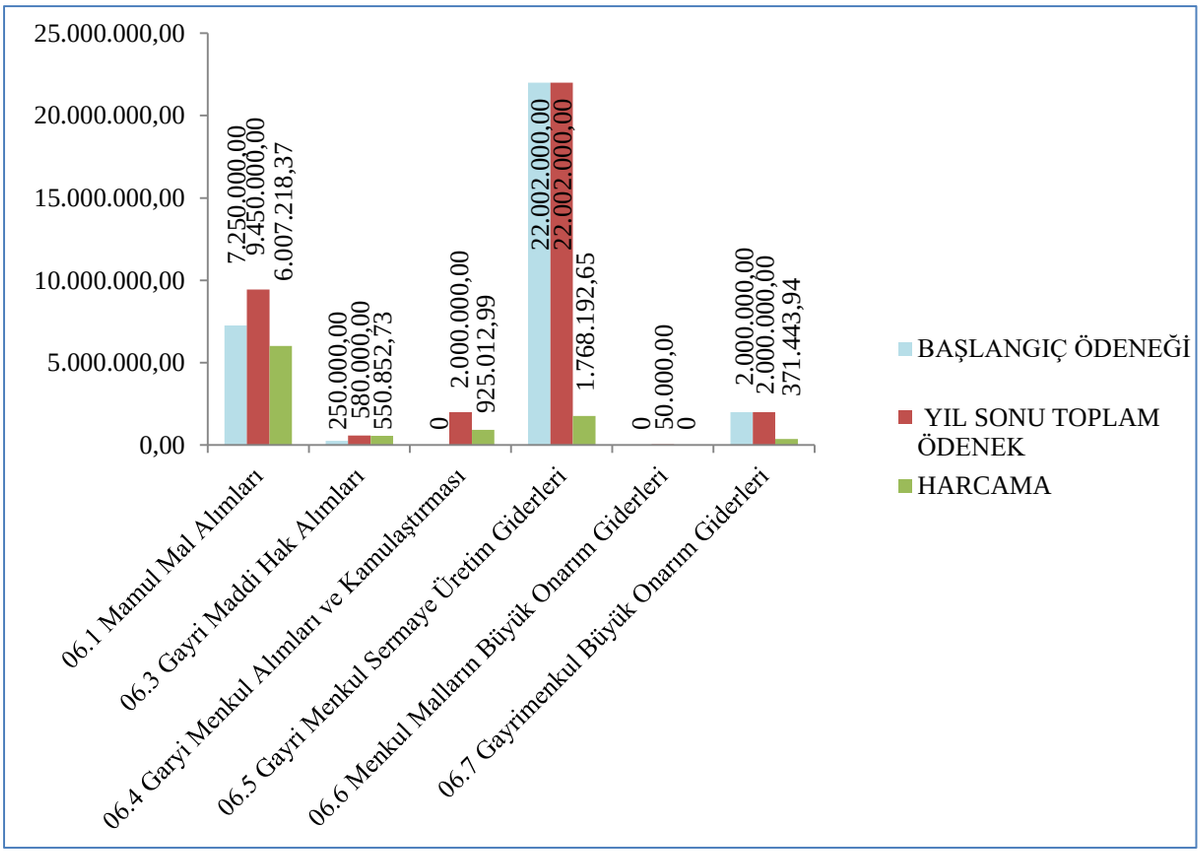


2016 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TUTARLARI (TL)				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	**YIL SONU TOPLAM ÖDENEK**	**HARCAMA**	**GERÇEKLEŞME DURUMU %**
01-Personel Giderleri	69.210.000,00	73.359.372,00	72.904.218,10	99,40
02- Sosyal Güv.Kur.Devl.Prm.Gid	9.245.000,00	10.200.870,00	10.075.943,76	98,77
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.732.000,00	24.536.679,47	21.990.885,49	89,62
05-Cari Transferler	2.090.000,00	2.095.400,00	1.898.138,54	90,58
06-Sermaye Giderleri	31.502.000,00	36.082.000,00	9.622.720,68	26,67
TOPLAM	**132.779.000,00**	**146.274.321,47**	**116.491.906,57**	**79,64**

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere başlangıç ödeneğinin %23,73'ünü, yıl sonu toplam ödeneğin %24,67'sini, toplam harcamanın da %8,26'sını sermaye giderleri oluşturmaktadır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

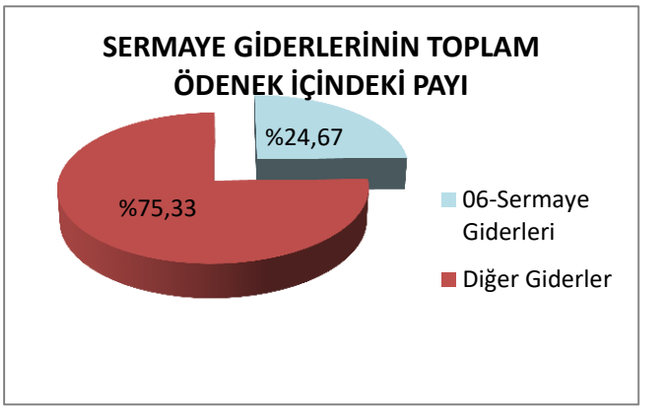

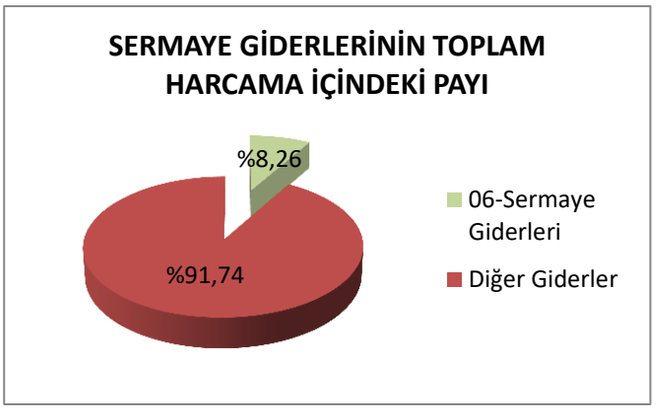

3.2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2016 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 5 adedi eğitim/yükseköğretim sektörüne, 1 adedi eğitim/beden eğitimi ve spor sektörüne, 1 adedi de sağlık sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

PROJE NO	PROJE ADI	2016 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YIL SONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ		**29.002.000,00**	**31.582.000,00**	**8.082.965,99**
2016H032420	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi(DOKAP)	100.000,00	100.000,00	0
2008H032550	Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)	19.900.000,00	19.900.000,00	1.272.094,22
2008H032560	Kampüs Alt Yapısı(DOKAP)	2.000.000,00	2.000.000,00	496.098,43
2016H032430	Muhtelif İşler(DOKAP)	6.500.000,00	9.080.000,00	5.821.740,74
2010H020130	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DOKAP)	2.000,00	2.000,00	0
2016H032440	Yayın Alımı(DOKAP)	500.000,00	500.000,00	493.032,60
SAĞLIK SEKTÖRÜ		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**614.741,70**
2016I000230	Muhtelif İşler	2.500.000,00	2.500.000,00	614.741,70
KAMULAŞTIRMA		**0**	**2.000.000,00**	**925.012,99**
GENEL TOPLAM		**31.502.000,00**	**36.082.000,00**	**9.622.720,68**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2008H032550
PROJE TUTARI	160.000.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	19.900.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Eynesil MYO İkmal İnşaat (1.000 m^2), Müzik Eğitimi Binası (1.000 m^2), TOKİ 1.Etap (47.381 m^2)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2018
2016 YILI HARCAMASI	1.272.094,22 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%6,39

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak 19.900.000,00 TL tahsis edilmiştir. Proje 2008-2017 yıllarını kapsamaktadır. Projenin 2015 yıl sonu kümülatif harcaması 92.841.000,00 TL'dir. Bu proje detayına 2016 yılı için Eynesil MYO İkmal İnşaat (1.000 m^2) , Müzik Eğitimi Binası (1.000 m^2) ve TOKİ I.Etap (47.381 m^2) yapım işleri alınmış olup, yıl içinde yalnızca Eynesil MYO İkmal İnşaatı işi tamamlanmıştır. 2016 yıl sonu harcaması 1.272.094,22 TL olup harcamanın ödeneğe oranı %6,39'dur. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise %58,82'dir.

Proje dahilinde olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binalarının yapımını içeren TOKİ 1.Etap (47.381 m^2) işi, TOKİ tarafından ihale edilmiş, ancak yer teslimi yapıldıktan sonra arazinin projeye uygun olmadığı TOKİ tarafından rapora bağlanmıştır. Bu sebeple proje hayata geçirilememiş olup İhtiyaç duyulan arsa değişikliğinin temini çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamındaki bir diğer iş olan Müzik Eğitimi Binası (1.000 m^2) 2017 yılı için 3.500 m^2 olarak revize edilip yatırım programına alınmıştır. İnşaatın yapımına 2017 yılında başlanacaktır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2008H032560
PROJE TUTARI	13.000.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	2.000.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2017
2016 YILI HARCAMASI	496.098,43 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%24,80

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesine 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak 2.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. Proje 2008-2017 yıllarını kapsamaktadır. Projenin 2015 yıl sonu kümülatif harcaması 9.960.000,00 TL'dir. Bu proje detayına 2016 yılı için D.Gaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı işleri alınmış olup 2016 yıl sonu harcaması 496.098,43 TL'dir. Harcamanınödeneğe oranı %24,80'dir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise %80,43'tür.

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Güre Yerleşkesi öğrenci girişini personel girişinden ayıran giriş kapısı turnikeleri ve güvenlik kulübesi için ihtiyaç duyulan elektrik tesisatı yapımı, kampus içi çevre düzenlemeleri, Rektörlük önü tören alanının düzenlenmesi, 25 araçlık mevcut açık otopark üzerine sundurma yapımı, Çamlık lojmanları kanalizasyon tamiri ve tadilatı, güvenlik amaçlı tel çit yapılması, Şebinkarahisar yerleşkesinin kanalizasyon alt yapısı için malzeme temini, 2015 yılında Güre Yerleşkesine peyzaj düzenlemesi işi kapsamında yapılan park içerisinde zemini hazırlanmış bulunan kısmın kapatılarak 190 m^2'lik kafeterya yapımı, Güre Yerleşkesi A-B Blok kanalizasyon işleri, Güre Yerleşkesi yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi için plan değişikliği hizmet alımı, yürüyüş alanı yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2010H020130
PROJE TUTARI	7.000.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	2.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Salonu (1600 Seyirci Kapasiteli)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2010-2017
2016 YILI HARCAMASI	-
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	-

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak 2.000,00 TL tahsis edilmiş olup tahsis edilen ödenekten harcama yapılmamıştır. Proje 2010-2017 yıllarını kapsamaktadır. Projenin 2015 yıl sonu kümülatif harcaması 624.000,00 TL'dir. Projenin bütünü itibariyle nakdi gerçekleşme oranı %8,91'dir. Bu proje detayına 2016 yılı için 1600 seyirci kapasiteli spor salonu yapım işi alınmış olup projenin uygulanacağı açık alanlar tam olarak kamulaştırılamadığı için projeye başlanamamıştır.

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2016H032420
PROJE TUTARI	100.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	100.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	-
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	-

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'ne 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak 100.000,00 TL tahsis edilmiş olup tahsis edilen ödenekten yıl içinde harcama yapılmamıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2016H032430
PROJE TUTARI	6.500.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	6.500.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	9.080.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-18(1 adet)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	5.821.740,74 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%64,12

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir. Proje tutarı olarak 6.500.000,00 TL tahsis edilmiş olup yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda 2.580.000,00 TL ödenek ilavesi yapılarak revizeli proje ödeneği 9.080.000,00 TL olmuştur. Projenin 2016 yıl sonu harcaması 5.821.740,74 TL olup harcamanın ödeneğe oranı %64,12'dir.

Bu proje kapsamında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

RROJE NO	2016H032430
PROJE TUTARI	2.000.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	2.000.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Gayrimenkul Büyük Onarım
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	371.443,94 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%18,57

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Gayrimenkul Büyük Onarım giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,

- Gazipaşa Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO tadilatı
- Güre Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı giriş kapılarının yapımı
- Uluslararası Öğrenci Ofisi tadilatı

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

- Yemekhane Binası tadilatı
- Espiye MYO derslik binası, yangın kapıları ve giriş kapılarının değiştirilmesi
- Merkez Kütüphane binası su hidroforları bakım ve onarımı
- Güre Yerleşkesi öğrenci girişi güvenlik kulübesi yapımı
- Güre Yerleşkesi ve Gazipaşa Yerleşkesindeki muhtelif birimlerde yapılan muhtelif bakım onarım işleri
- Tirebolu İletişim Fakültesi sistem odası yerinin değişimi,
- Rektörlük Ek Hizmet binası konferans salonu sahne tadilatı,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü çatı bakım onarımı
- Sağlık Hizmetleri MYO binası bakım onarımı
- Güre yerleşkesi Eğitim Fakültesi muhtelif yerlerinde yaptırılacak olan elektrik tesisat ve inşaat imalatlarına ait bakım onarımı
- Dereli Meslek Yüksekokulu binasında yapılan tadilat ve onarımı
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının çatı kaplaması ve olukların yenilenmesi
- Keşap Meslek Yüksekokulu binasına ledli tabela yaptırılması
- Güre yerleşkesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı isimlikler ve yönlendirme levhaları yapımı
- Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tabela yenileme ve bakım onarımı
- Lojmanlar ısı merkezindeki sirkülasyon pompalarının onarımı
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu C Blok çatı kaplamasının yenilenmesi
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan mevcut pencere doğramalarının yenilenmesi
- İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Fen edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Binalarının asansörlerinin bakım onarımı
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinin imalat, demontaj ve bakım onarımı
- Kamelya, çay ocağı ve güvenlik kulübesi bakım onarım işleri yapılmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

RROJE NO	2016H032430
PROJE TUTARI	250.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	250.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	1.280.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	1.250.592,73TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97,70

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,

- Sistem Odasına Cihaz Alımı ve Güre Yerleşkesine FKM kurulumu
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Log kayıtlarını tutmak için gerekli yazılım programı alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının web serverlardaki sağlayıcılarında kullanılan güvenlik protokol yazılımının (SSL) satın alımı
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılan UNİPA otomasyon programı güncellemesi
- Windows Server 2012 R2 satın alma
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarların güvenliğini korumak için anti-virüs yazılım programının (Server 999 Clinet) 3 yıllık kullanım hizmeti alımı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığının web serverlardaki servis sağlayıcılarında kullanılan güvenlik protokol yazılımının (WILCARD SSL-3 yıllık) alımı
- Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmakta olan e-hakediş yazılım programı ve e-kiknet programının güncellenmesi
- Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılan kütüphane otomasyon programı ve mobil kütüphane uygulamaları 2016 yılı güncellenmesi
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Üniversitemizin elektronik belge uygulaması sistemine (EBYS) geçiş işleri yapılmıştır.





Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

RROJE NO	2016H032430
PROJE TUTARI	4.250.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	4.250.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	5.800.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	4.199.704,07 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%73,04

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yıl içinde;

Büro mefruşatı alımları için 21.136,04 TL, büro makineleri alımları için 741.025,32 TL, bilgisayar alımları için1.031.470,85 TL, laboratuvar cihazı alımları için 1.600.396,18 TL, diğer makine teçhizat alımları için 506.125,60 TL, atölye gereçleri alımları için 34.692,00 TL ve laboratuvar gereçleri alımları için 264.858,08 TL olmak üzere Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 4.199.704,07 TL harcama yapılmıştır.





Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

3.2.3. Yayın Alımı Projesi

RROJE NO	2016H032440
PROJE TUTARI	500.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	500.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	493.032,60 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%98,61

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2016 yılı için 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 493.032,60 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %98,61 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında 421 adet basılı yayın alımı için 12.625,20 TL, 10 adet veri tabanı aboneliği alımı için 480.407,40 TL harcama yapılmıştır.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199



3.2.4. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi

RROJE NO	2016I000230
PROJE TUTARI	2.500.000,00 TL
PROJENİN 2016 YILI ÖDENEĞİ	2.500.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Sağlık
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2016-2016
2016 YILI HARCAMASI	614.741,70 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%24,59

Üniversitemizin sağlık sektöründeki Muhtelif İşler Projesine 2016 yılı için 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 614.741,70 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %24,59 olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje kapsamında Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (Hastane) kullanılmak üzere tıbbi cihaz alımı yapılmıştır.

3.3. Kamulaştırma

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Spor Bilimleri Fakültesi ve 3.000 seyirci kapasiteli spor salonu işlerinin yapımına başlanabilmesi için ihtiyaç duyulan alanların bir kısmının kamulaştırması gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırma için 2016 yılında 925.012,99 TL harcanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Giresun Üniversitesinin bulunduğu bölgenin coğrafi koşulları göz önüne alındığında özellikle Üniversitemize ait fiziki alanların oluşturulması ve genişletilmesi oldukça güçleşmektedir. Bu durum Üniversitemizde yeni binaların oluşturulması, mevcutların bakım-onarımının yapılması, gerekli çevre düzenlemeleri ve kampüs alt yapı çalışmalarının kimi zaman süresi içinde bitirilememesine ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak;

- ✓ Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının Yatırım Programında belirtilen projeler için yıl içerisinde ihtiyaç duyulan zaman ve tutara göre hazırlandığı, dolayısıyla AFP tekliflerinin bu şekliyle dikkate alınması ve vize aşamasında mümkün olduğu kadar değişikliliğe gidilmemesi,
- ✓ Gelişmekte olan Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu fiziki yapıyı tamamlayabilmesi için yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerektiği düşünülmektedir.

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda Üniversitemiz ilgili birimlerinin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personelin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi gibi hususların yatırım çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte, sürecin uzun olması sebebiyle de planlanan yatırımlar aksayabilmektedir. Bu yönde söz konusu sürelerin ihalelerin daha kısa zamanda

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi sonunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Ayrıca Kurumlarca; üniversitelerden yatırım projelerinin takibine yönelik yıl içerisinde birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, kimi zaman verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Yatırım izleme raporlarının tek bir sistem üzerinden güncellenmesi zaman kaybını önleyecek, raporlamanın etkinliğini, doğruluğunu artırarak projelerin takibini kolaylaştıracaktır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.033, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1199

5. 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		187.100			103.425			29.002			31.582			8.083
Sağlık	1		2.500						2.500			2.500			615
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM			**189.600**						**31.502**			**34.082**			**8.698**

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
