T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2019

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1

2. GENEL DEĞERLENDİRME 2

2.1. MİSYONUMUZ 2

2.2. VİZYONUMUZ 2

2.3. DEĞERLERİMİZ 2

2.4. İLKELERİMİZ 3

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 3

2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLAR 6

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 8

2.8. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 16

3. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI 19

3.1. DEVAM EDEN PROJELER 20

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 20

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi 24

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 25

3.2. TAMAMLANAN PROJELER 25

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 25

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi 26

3.2.3. Yayın Alımı Projesi 31

3.2.4. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi 32

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 33

5. 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 35

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 65'inci madde ile kurulan Giresun Üniversitesi 2018 yılı itibariyle **31.616** öğrencisi, **955** akademik ve **368** idari personeli ile 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 13 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 4 bölüm ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Üniversitemizin 2018 yılındaki yatırım projelerinde yer alan ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Yatırım projelerinin izlenmesi ve yetkili mercilerce değerlendirilmesi gayesiyle; Üniversitemizce yürütülen yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren 2018 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlığını taşıyan 25'inci ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Üniversitemizin 2018 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN
Rektör

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.MİSYONUMUZ



Üniversitemizin misyonu, milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; kent, bölge ve ülkede toplumun ufkunu genişletmek, insanlığın ilerleyişine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaktır.

2.2.VİZYONUMUZ



Giresun Üniversitesi'nin vizyonu; bilgi ile güçlendirilmiş kaliteli eğitim veren, ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilen, eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslar arası öneme sahip bilgi limanı olmaktır.

2.3.DEĞERLERİMİZ

- Atatürkçülük
- Yurtseverlik
- Hukukun üstünlüğü
- Bilimsellik
- Katılımcılık
- Toplumsal yararlılık
- Güvenilirlik
- Sorumluluk
- Saydamlık

- Evrensellik
- Araştırmacılık
- Kalite ve verimlilik
- Fırsat eşitliği
- Çevre bilinci
- Hesap verebilirlik
- Özgürlük
- Çağdaşlık

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.4.İLKELERİMİZ

- Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek ve arttırmak
- Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek
- Başarıyı önemsemek
- Gelişime ve yeniliklere açık olmak
- Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek
- Ulusal kimliğe sahip çıkmak ve evrensel değerleri bağdaştırmak
- Kaynakları imkanlar dahilinde verimli şekilde kullanmak
- Adaletli bir yönetm politikası izlemek
- İçinde yaşanılan çevre ve topluma duyarlı olmak
- Kültürel ve ahlaki değerleri korumak

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Hedef 1.1: Akademik atama ve yükseltme kriterlerini düzenlemek

Hedef 1.2: Akademik ve İdari personel sayısın artırmak

Hedef 1.3: Çift anadal ve yandal diploması veren programlarını başlatmak

Hedef 1.4: Lisansüstü programlarının niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmek

Hedef 1.5: Eğitim-istihdam uyumlu programlar açmak

Hedef 1.6: Avrupa Yükseköğretim alanı için Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni (AKTS) tamamlamak

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Hedef 1.7: Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

Hedef 1.8: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemlerinden yararlanma oranını artırmak

Hedef 1.9: Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamak

Stratejik Amaç 2: Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Hedef 2.1: Öğretim elemanlarının akademik yayınlarını bilişim teknolojileriyle erişilebilir hale getirmek.

Hedef 2.2: Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni akredite etmek.

Hedef 2.3: Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve projeleri desteklemek

Hedef 2.4: Kütüphanedeki bilgi kaynağı sayısını artırmak.

Hedef 2.5: Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlamak.

Stratejik Amaç 3: Fiziki Ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi

Hedef 3.1: Kurumsal gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet binalarını inşa etmek

Hedef 3.2: Fiziki yorgunluk görülen binaları bakım - onarım ve tadilatla güçlendirmek.

Hedef 3.3: Yerleşke alanlarında spor sahaları, kantin, kafeterya, yemekhane ve konferans salonu vb. inşaatları tamamlayarak faaliyete geçmelerini sağlamak.

Hedef 3.4: İhtiyaç duyulan alanların kamulaştırılmasını sağlamak

Hedef 3.5: Eğitim-öğretimi makine teçhizatla donatılmış mekanlarla desteklemek

Hedef 3.6: Mevcut Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (Hastane) binalarının hizmet için ihtiyaç duyduğu bakım onarımını yapmak ve makine-teçhizatla donatmak

Hedef 3.7: Bilişim sistemlerinin alt yapısını tamamlamak, entegre hale getirmek ve e-imzaya geçişi sağlamak.

Hedef 3.8: Üniversite olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini almak.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Stratejik Amaç 4: Uluslararasılaşmayı geliştirmek

Hedef 4.1: Uluslararasılaşmanın kurumsal altyapısını geliştirmek

Hedef 4.2: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının lisans ve lisansüstü düzeyinde artırılması.

Hedef 4.3: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci kalitesini artırmak

Hedef 4.4: Akademik personelin uluslararası akademik faaliyetinin artırılması

Stratejik Amaç 5: Üniversite Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 5.1: Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaşatmaya yönelik bilimsel araştırma yapmak ve etkinlikler düzenlemek

Hedef 5.2: Sağlık konusunda bilgilendirici sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek.

Hedef 5.3: Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

Hedef 5.4: Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak

Hedef 5.5: Toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI

a) Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri

5) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

b)Yasal Dayanaklar

2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46'ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayılabilir.




Üniversitemiz 2018 yılında bütçe geliri olarak toplam **159.744.000,00** TL tahmin edilmiş, yıl içinde **151.482.751,67** TL gelir elde edilmiştir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2018 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL)

Açıklama	Planlanan Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.849.000,00	4.452.765,01	91,82
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.182.000,00	141.331.650,00	94,73
Diğer Gelirler	5.713.000,00	5.698.336,66	99,74
TOPLAM	**159.744.000,00**	**151.482.751,67**	**94,82**

Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Dağılımı

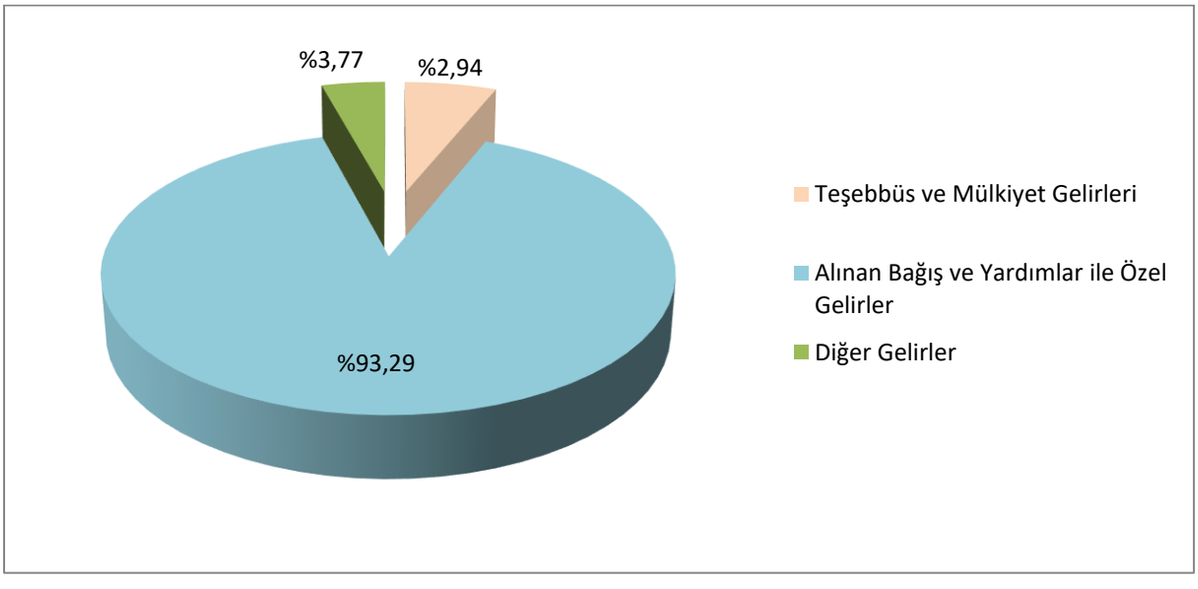

Bununla birlikte Üniversitemizin 2018 yılında bütçe geliri 159.744.000 TL olarak öngörülmüş, yıl içinde yapılan 25.716.593 TL ödenek eklenmesi sonuna toplam ödenek 185.460.593 TL'ye ulaşmış ve bu ödenekle 180.712.279,04 TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2018 yıl sonu itibarıyla 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet Konservatuvarı, 13 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Giresun Üniversitesi Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkeleriyle 825.517,07 m^2 arazi yüzölçümü ve 186.523 m^2 yapı alanına sahiptir.



Kale Mevkiinde yer alan Merkez Rektörlük binası bünyesinde Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü bulunmaktadır.

Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Rektörlük Ek Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü,



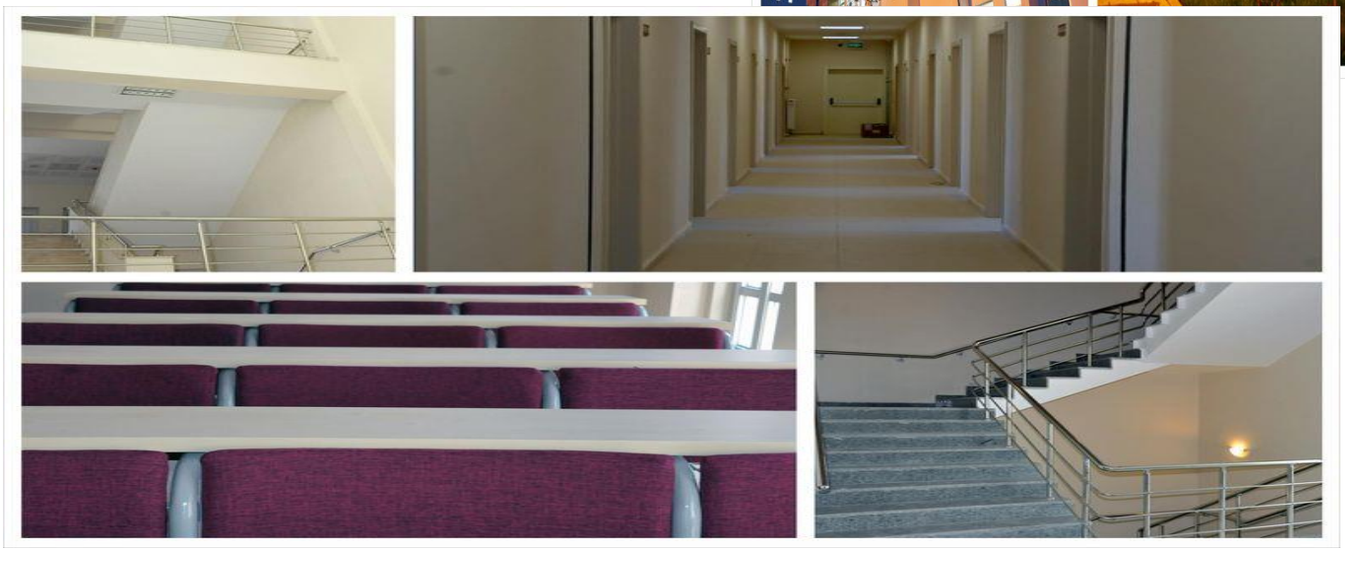

bölüm başkanlıkları, engelli öğrenci birimi, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRUMLAB) ile Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi (TÖMER), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, AB Erasmus Ofisi, AR-Ge Koordinatörlüğü, personel ve öğrenci yemekhaneleri ile açık spor alanları, merkez kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir.



Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uygulama oteli (misafirhane), kapalı spor salonu, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır.

Şehir merkezimizde bulunan bir diğer yerleşkemiz de Nizamiye yerleşkesidir. Üniversite hastanesi ile Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nin afilasyon protokolü kapsamında birleşmesi sonucu poliklinik hizmetlerinin bir kısmı burada görülmektedir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Okulumuzun



bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Bulancak, nüfus itibariyle Giresun ilinin en büyük ilçesidir. Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda ağırlıklı olarak Turizm sektörüne yönelik vasıflı eleman yetiştirilmektedir. Ayrıca bu ilçede konumlanacak olan Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2017 yılında kurulmuştur.

Dereli Meslek Yüksekokulu Dereli ilçemizde, Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ilçemizde, Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde, Keşap Meslek Yüksekokulu ise Keşap ilçemizde konumlanmıştır.



Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele ilçesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Piraziz Meslek Yüksekokulu Piraziz ilçesinde yer almaktadır.

Piraziz Meslek Yüksekokulu, Piraziz ilçesinde bulunmakta olup 20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı 2547 sayılı Yasa'nın 2880 sayılı Yasayla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır.

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar ilçe

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

merkezinde yer almaktadır. Yerleşke bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır.

Tirebolu İletişim Fakültesi ile Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Bünyelerinde laboratuvarlar, konferans salonları, donanımlı teknoloji sınıfı ve kütüphane mevcuttur. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokuluna bağlı bir bölüm Doğankent ilçemizde faaliyet göstermektedir.



Mevcut Alanların Dağılımı

	TOPLAM KULLANIM ALANI (m^2)
Rektörlük Binası(Şehir)	1809
Nizamiye Ön Blok	4604
Nizamiye Arka Blok	160
Gazipaşa A Blok	2.792
Gazipaşa B Blok	1.474
Gazipaşa C Blok	5.048
Gazipaşa MYO	1.355
Gazipaşa Misafirhane/Uygulama Oteli	820
Gazipaşa Prefabrik (Tıp Fakültesi)	592
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	1.176
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	150
Gazipaşa Mobilya Atölye Depo	53
Gazipaşa Son Prefabrik	159,90
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	115
Güre A-B-C Bloklar	5.360
Güre D-E Bloklar	4.250
Güre F-G-H Bloklar	5.280
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056
Güre Yemekhane ve Sos.Tes.Binası	5.912
Güre Isı Merkezi	202
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468
Güre Prefabrik (Spor Bilimleri Fakültesi)	416
Güre Lojmanlar	4.928
Ahmet Yılmaz Lojmanlar	2.094

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Deney Hayvanları Laboratuvarı	259
Güre Kafetarya	191
Güre Anfi	885
Şelale	613
Sundurma Açık Otopark	240
Güre Personel Yemekhanesi	1.040
Spor Bilimleri Fakültesi	7.712,60
Diş Hekimliği Fakültesi - Turizm Fakültesi	468
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356
Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.950
Espiye MYO(MEB)	3.760
Espiye MYO(SYDV)	3.324
Şebinkarahisar UBYO	3.733
Bulancak UBYO	4.752
Görele UBYO	2.584
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	6.370
Alucra MYO	5.276
Şebinkarahisar MYO(Teknik)	5.270
Şebinkarahisar MYO(Sosyal)	2.720
Şebinkarahisar İşlik	732,52
Şebinkarahisar Fırın	217,26
Şebinkarahisar Kazan Dairesi	176,67
Şebinkarahisar Yemekhane	1.629,98
Tirebolu MBMYO	2.600
Çok Amaçlı Salon	1.164
Doğankent	5.226
Eynesil Kamil NALBANT MYO	4.089
Keşap MYO	1.675
Keşap Turizm Fakültesi	6.759
Dereli MYO	3.538
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848
Sahil SET (Kafeterya)	203
Sahil SET (Rektörlük Konutu)	463
Sahil SET (Havuz)	200
Sahil SET (Apart Evler)	207
Sahil SET (Kreş)	459
Sahil SET (Lojman)	672
Fen-Edebiyat Fak. I.Kısım	44.134
Fen-Edebiyat Fak. II.Kısım	10.755
T O P L A M	**203.525,93**

2018 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 955 akademik, 368 idari toplam 1323 personel bulunmaktadır. Üniversitemizde 2018 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

2018 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYILARI			
	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	68	17	85
Doçent	64	62	126
Dr. Öğr. Üyesi	346	42	388
Öğretim Görevlisi	321	128	449
Araştırma Görevlisi	156	73	229
TOPLAM	**955**	**322**	**1277**

2018 YILI İDARİ PERSONEL SAYILARI					
Sınıflara Göre	**Kadroların Doluluk Oranına Göre**		**Cinsiyete Göre**		**Toplam**
	Dolu	**Boş**	**K**	**E**	
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	248	222	87	161	470
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	41	179	34	7	220
Teknik Hizmetler Sınıfı	51	63	6	45	114
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	-	2	2	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	23	19	1	22	42
TOPLAM	**368**	**483**	**130**	**238**	**851**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

İdari personel sayısı içersindeki en büyük payı % 67,39 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir.



2018 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı 31.616'dir. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAKÜLTELER / KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	-	-	-	-	-
Eğitim Fakültesi	1832	984	502	252	3570
Fen Edebiyat Fakültesi	747	470	393	357	1967
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	119	79	-	-	198
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	646	756	408	693	2503
İslami İlimler Fakültesi	299	150	192	140	781
Mühendislik Fakültesi	255	562	10	48	875
Sağlık Bilimleri Fakültesi	639	155	-	-	794
Spor Bilimleri Fakültesi	134	278	1	38	451
Tıp Fakültesi	174	191	-	-	365
Tirebolu İletişim Fakültesi	331	405	-	-	736
Turizm Fakültesi	-	-	-	-	-
Devlet Konservatuvarı	57	71			128
TOPLAM	**5233**	**4101**	**1506**	**1528**	**12368**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	250	281	-	-	531
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	29	40	-	-	69
Sosyal Bilimler Enstitüsü	498	504	6	118	1126
TOPLAM	**777**	**825**	**6**	**118**	**1726**

YÜKSEKOKULLAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	209	446	64	139	858
Görele Ubyo	200	203	189	168	760
Şebinkarahisar Ubyo	301	98	219	125	743
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	**710**	**747**	**472**	**432**	**2361**

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Alucra Turan Bulutçu Myo	497	440	107	156	1200
Dereli Myo	135	143			278
Espiye Myo	328	395	210	348	1281
Eynesil Kamil Nalbant Myo	507	91	417	64	1079
Keşap Myo	180	175	47	29	431
Sağlık Hizmetleri Myo	573	246	199	160	1178
Sosyal Bilimler Myo	873	746	345	578	2542
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Myo	608	616	126	202	1552
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Myo	216	587	4	13	820
Teknik Bilimler Myo	483	1362	178	1003	3026
Tirebolu Mehmet Bayrak Myo	669	771	132	202	1774
Bulancak Endüstriyel Sanatlar MYO	-	-	-	-	-
Piraziz Myo	-	-	-	-	-
TOPLAM	**5069**	**5572**	**1765**	**2755**	**15161**
GENEL TOPLAM	**11789**	**11245**	**3749**	**4833**	**31616**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

2.8. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


Üniversitemizin 2018 yılı yatırımlarıyla ilgili bütçe tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 31.500.00,00 TL iken, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5. maddesi uyarınca 5.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak Üniversitemiz yıl sonu sermaye ödeneği toplam 37.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 34.656.622,88 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğe oranı % 93,67'dır.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2018 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2018 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2018 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	30.998.000,00	34.983.000,00	34.003.149,88	97,20
Eğitim/Beden Eğitimi Spor	1	500.000,00	515.000,00	512.710,00	99,55
Kamulaştırma		2.000,00	1.502.000,00	140.763,00	9,37
TOPLAM	**6**	**31.500.000,00**	**37.000.000,00**	**34.656.622,88**	**93,67**

2018 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2018 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2018 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	3.748.000,00	6.284.000,00	6.217.257,97	98,94
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000,00	804.000,00	224.412,04	27,91
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	1.502.000,00	140.763,00	9,37
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.398.000,00	26.898.000,00	26.885.169,87	99,95
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	1.510.000,00	1.189.020,00	78,74
TOPLAM		**31.500.000,00**	**37.000.000,00**	**34.656.622,88**	**93,67**


Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

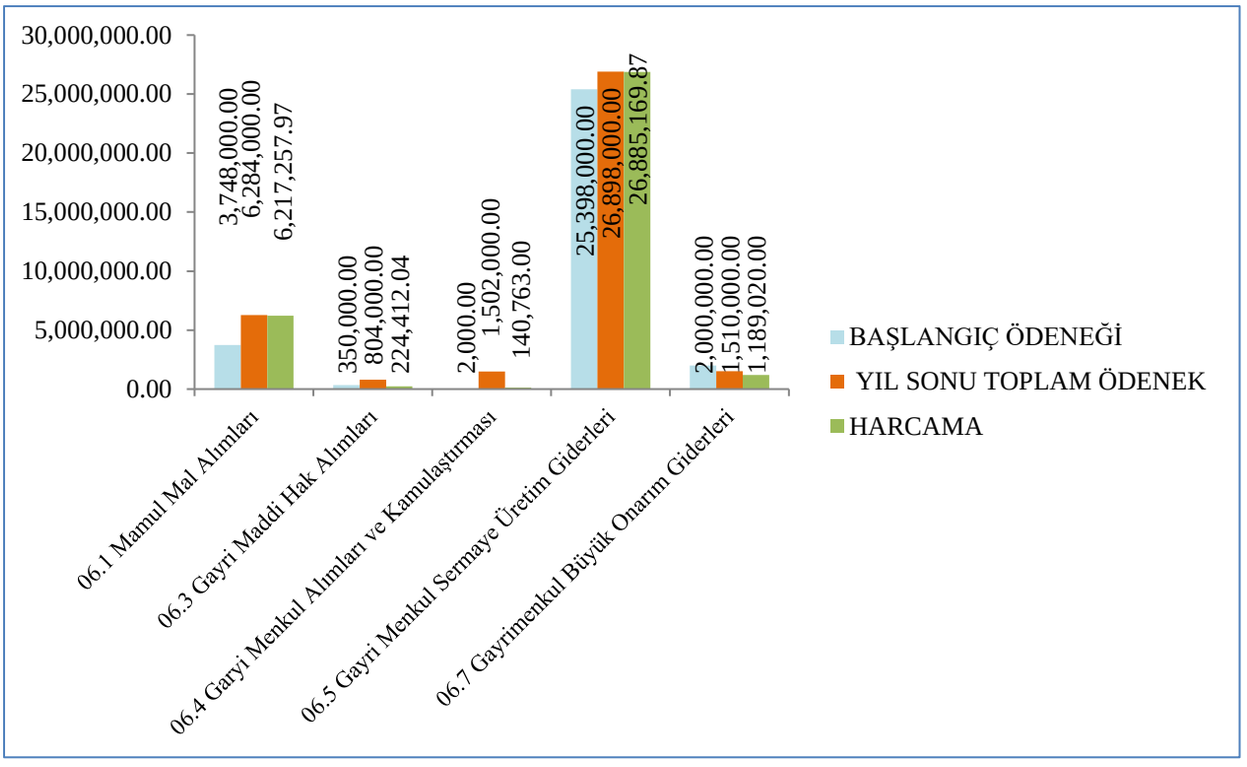

2018 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TUTARLARI (TL)				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	**YIL SONU TOPLAM ÖDENEK**	**HARCAMA**	**GERÇEKLEŞME DURUMU %**
01-Personel Giderleri	90.621.000,00	109.137.490,00	108.464.278,29	99,38
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	12.553.000,00	15.302.600,00	15.268.597,25	99,78
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.155.000,00	21.076.103,00	19.660.687,46	93,28
05-Cari Transferler	2.915.000,00	2.944.400,00	2.662.093,16	90,41
06-Sermaye Giderleri	31.500.000,00	37.000.000,00	34.656.622,88	93,67
TOPLAM	**159.744.000,00**	**185.460.593,00**	**180.712.279,04**	**97,44**

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere başlangıç ödeneğinin % 19.71'ini, yıl sonu toplam ödeneğin %19,95'ini, toplam harcamanın da %19.17'sini sermaye giderleri oluşturmaktadır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

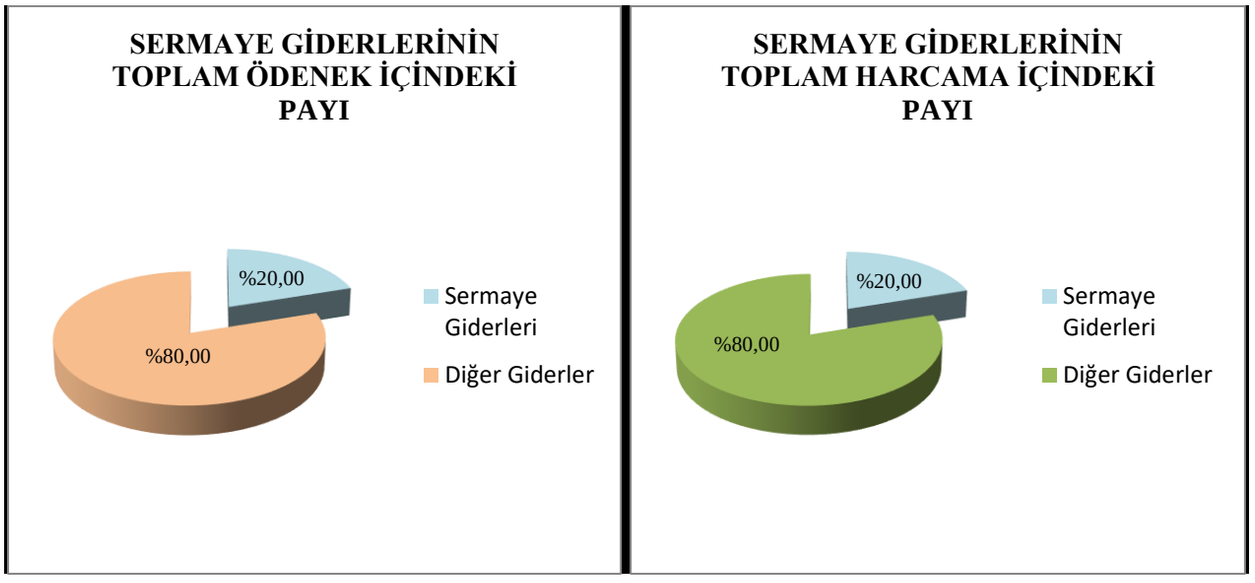

3.2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2018 yılında toplam 6 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 5 adedi eğitim/yükseköğretim sektörüne, 1 adedi eğitim/beden eğitimi ve spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

PROJE NO	PROJE ADI	2018 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YIL SONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ		**31.498.000,00**		
2018H033690	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)	98.000,00	0	0
2008H032550	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	21.300.000,00	23.988.000	23.976.645,00
2008H032560	Kampüs Alt Yapısı (DOKAP)	4.000.000,00	2.910.000	2.908.524,00
2018H033820	Muhtelif İşler (DOKAP)	4.800.000,00	7.285.000,00	6.337.483,00
2010H020130	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	500.000,00	515.000,00	512.710,00
2018H033730	Yayın Alımı (DOKAP)	800.000,00	800.000,00	780.496,00
KAMULAŞTIRMA		**2.000,00**	**1.502.000,00**	**140.763,00**
GENEL TOPLAM		**31.500.000,00**	**37.000.000**	**34.656.621**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2008H032550
PROJE TUTARI	32.400.000,00 TL
PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	21.300.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	2.688.000 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Bilimleri Fakültesi (7.990 m^2), Turizm Fakültesi (6957 m^2), Şebinkarahisar Yemekhane Binası (1.630 m^2)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2020
2018 YILI HARCAMASI	23.976.645
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%99

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2018 yılı için 21.300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan ilavelerle proje ödeneği 23.988.000,00 ye ulaşmıştır.

2008-2020 yıllarını kapsayan Projenin 2017 yıl sonu kümülatif harcaması 4.400.000,00 TL'dir. Bu proje detayına 2018 yılı için Spor Bilimleri Fakültesi (7.990 m^2), Turizm Fakültesi (6.957 m^2), Şebinkarahisar Yemekhane Binası (1.630 m^2) yapım işleri alınmıştır.

Projenin 2018 yılsonu harcaması 23.976.645 TL olup harcamanın ödeneğe oranı %99.95'tir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise %58,88'dir.

Derslik ve Merkezi birimler projesi dahilinde, Spor Bilimleri Fakültesi hizmetinde kullanılacak eğitim binasının yapımına esas avan ve uygulama projeleri doğrultusunda ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Turizm Fakültesi bina yapım işi icra edilmiş ve tamamlanmıştır. Ayrıca Şebinkarahisar Yemekhane Binası yapım işi bitirilmiştir.

* 2018 yılı yatırım programında kapalı alanı 7.990 m^2olarak yer alan **Spor Bilimleri Fakültesi** binası yapım işine devam edilmiş olup 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



* 2018 yılı yatırım programında kapalı alanı 6.957 m² olarak yer alan **Turizm Fakültesi** binası yapım işi planlandığı gibi 2018 yılı sonunda tamamlanmıştır.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

* 2018 yılı yatırım programında yer alan 1.630 m²'lik **Şebinkarahisar Merkezi Yemekhane** Binasının yapım işi ihalesi 10.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bina 2018 yılında tamamlanmıştır.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2008H032560
PROJE TUTARI	21.000.000,00 TL
PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	4.000.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	2.910.000
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2020
2018 YILI HARCAMASI	2.908.524
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%75,7

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesine 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 4.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. Proje 2008-2020 yıllarını kapsamaktadır. Projenin 2017 yıl sonu kümülatif harcaması 13.000.000,00 TL'dir. Bu proje detayına 2018 yılı için D.Gaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı işleri alınmış olup 2017 yıl sonu harcaması 2.908.524 TL'dir. Harcamanın ödeneğe oranı % 72,7'dir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise % 69,70'tir.

Bu proje kapsamında; Güre yerleşkesinde çevre düzenleme işi, Üniversite birimlerinin telefon, elektrik, aydınlatma ve kompanzasyon tesisatlarının yenilenmesi, Üniversitemiz Güre ve Gazipaşa yerleşkesinde doğalgaz borularının döşenmesi ve muhtelif binaların ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi, fiber alt yapı yenilenmesi, rektörlük hizmet binası klima santrali bakımı ve arızalı kanal tipi aspiratörlerin onarımı vb. gerçekleştirilmiştir.

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2010H020130
PROJE TUTARI	7.400.000,00 TL
PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	500.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	515.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat- Spor Salonu (3000 Seyirci Kapasiteli)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2010-2020
2018 YILI HARCAMASI	512.710,00 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,94

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 500.000,00 TL tahsis edilmiş olup, projeye ihtiyaçlar doğrultusunda 15.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Proje 2010-2020 yıllarını kapsamaktadır. Tahsis edilen ödenekten 512.710,00 TL makine teçhizat alımı yapılarak % 99.94 gerçekleşme oranına ulaşılmış ancak kamulaştırma işlemleri tamamlanamadığından spor salonunun yapımına başlanamamıştır.

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2018H033690
PROJE TUTARI	98.000,00 TL
PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	98.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	0
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
2018 YILI HARCAMASI	0
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	0

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'ne 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 98.000,00 TL tahsis edilmiş ancak her hangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2018H033820
PROJE TUTARI	4.800.000,00 TL
PROJENİN 2017 YILI ÖDENEĞİ	4.800.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	7.285.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
2018 YILI HARCAMASI	6.337.483,47 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 86,99

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir. Proje tutarı olarak 4.800.000,00 TL tahsis edilmiş olup yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda projeye 2.485.000,00 TL ödenek ilavesi yapılarak revizeli proje ödeneği 7.285.000,00 TL olmuştur. Projenin 2018 yıl sonu harcaması 6.337.483,47 TL olup harcamanın ödeneğe oranı % 86,99'dur.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

Bu proje kapsamında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT RROJE NO	2018H033820-1
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Büyük Onarım
ALT PROJE TUTARI	2.000.000,00 TL
PALT ROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	2.000.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	1.510.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Gayrimenkul Büyük Onarım
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
ALT PROJE 2018 YILI HARCAMASI	1.189.020,00 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 78,74

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Gayrimenkul Büyük Onarım giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,
- Güre Yerleşkesi İ.İ.B.F. Dekanlık Binası bodrum katı bk/b-01 koridoruna alçı levhalarla duvar kaplaması yapılması
- Dereli MYO elektrik tesisatı ve inşaat bakım onarım işine ait hakediş ödemesi
- Tirebolu MYO, İİBF ve Gazipaşa Yerleşkesinde pvc ve alüminyum doğramadan imalatlar yapılması
- Espiye Meslek Yüksekokulu binasında bakım onarım ve tadilat yapılması
- Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO binasında yaptırılacak tadilat ve imalat işleri
- Güre Yerleşkesi 1000 kwh dağıtım transformatörü bakım onarım işi
- Öğrenci giriş çıkış turnikelerinin üzerinin kapatılması
- Tirebolu İletişim Fakültesi çatısına oluk yapılması ve muhtelif yerlerde bakım onarım yapılması
- Rektörlük binası asansörü çevreleyen duvarın alçı ve boya yapılması
- Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO B Blok çatısının bakım onarımı
- Rektörlük binası bozulan giriş sahanlığı zemininin tadilatı
- Rektörlük binası makam katı ve personel çay ocaklarının genişletilmesi
- Tirebolu İletişim Fakültesi bilgisayar altyapısı yenilenmesi ve muhtelif elektrik tesisatı arızalarının bakım onarımı
- Alucra Turan Bulutçu MYO binasının iç kısmında boya yaptırılması
- Tıp Fakültesi öğrencilerine tahsis edilen alanın dersliğe dönüştürülmesi

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

- Rektörlük Konferans Salonuna petek takılması ve alafranga tuvaletlerin alaturka tuvalete dönüştürülmesi
- Ahmet Yılmaz Lojmanları asansörünün bakım onarımı (revizyon yapım işi)
- Güre Yerleşkesinde yaptırılan imalat ve bakım onarımı
- Otopark alanında bina girişine demir merdiven yapılması ve muhtelif birimlerin çatı onarımı ile çeşitli demir işlerinin yapımı
- Kütüphane binasındaki asansörün bakım ve onarımı
- Güre Yerleşkesindeki birimlerde çeşitli imalat ve bakım onarım yaptırılması
- Güre Yerleşkesi İ.İ.B.F. dekanlık binası zemin katı muhtelif alanlarda oda bölünmesi
- Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının iç cephesinde boya yaptırılması
- Güre Yerleşkesi İslami İlimler Fakültesinin kullandığı binanın 5. katında bulunan b.506 nolu odanın alçıpan ile duvar bölme ve muhtelif imalatı
- Üniversitemizin muhtelif birimlerinde yaptırılacak bakım onarım faaliyetleri için malzeme alımı
- Güre Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi binalarındaki kullanılamaz haldeki wc kabin kapılarının değiştirilmesi
- Gazipaşa Yerleşkesi Tıp Fakültesinin kullandığı A Blok binası dış cephesinin boya yapılması
- Güre Yerleşkesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Grümlab) binasının muhtelif imalatı
- Güre Yerleşkesi eğitim ve hizmet binaları asansörlerinin revizyonlarının yapımı
- GRÜ tabela imalatları ve tabela bakım onarımlarının yaptırılması
- Merkez Rektörlük binası çatısında bakım onarım yapılması
- Rektörlük makam asansörünün arızalanan sürücüsünün ve ana panosunun yenilenmesi ve yemekhane yük asansörünün bakım onarımının yapılması
- Gazipaşa Yerleşkesinde bulunan binaların çatı onarımları ve yerleşkedeki tüm çatı oluklarının temizlenmesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi asansörlerinin revizyonlarının ve muhtelif asansörlerin onarımlarının yapılması
- Keşap MYO ön bahçesinin düzenlenmesi ve Güre Yerleşkesi muhtelif imalatı
- Öğrenci yemekhanesi girişine sundurma çatı yapılması ve çeşitli birimlerde muhtelif imalatların yapılması
- Öğrenci yemekhanesi girişine sundurma çatı yapılması ve çeşitli birimlerde muhtelif imalatların yapılması

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

- Gazipaşa ve Güre Yerleşkesinde bulunan birimlerin kırılmış pencere ve kapı doğramalarının değiştirilmesi ve arızalı kısımların onarılması
- Güre Yerleşkesinde bulunan Grümlab binası çatısının su alan kısımlarının tamiratı ve Gazipaşa Yerleşkesi A kapısı güvenlik kulübesine çatı yapılması ve muhtelif imalatı
- Üniversitemiz Yerleşkelerinde ihtiyaç duyulan çeşitli demir işlerinin yapılması

işleri yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT PROJE NO	2018H033820-2
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ALT PROJE TUTARI	350.000,00 TL
PALT ROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	350.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	804.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
ALT PROJE 2018 YILI HARCAMASI	224.412,04 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 27,91

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,

- Personel Otomasyon Yazılımı
- Öğrencilerle iletişim kurulması amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Sms alımı
- Logsign yazılım programının 2018 yılı güncellemesi
- Ünipa Otomasyon Sisteminin 2018 yılı güncellenmesi
- Üniversitemiz web sayfasının yenilenmesi için gerekli olan modüllerin satın alınması
- Uzaktan Eğitim Biriminin ihtiyacı olan yazılımların alımı
- Yordam Kütüphane Otomasyon Programının 2018 yılı güncellemesi
- e-Hak ediş yazılım programı (10 Kullanıcılı) ve e-Kiknet programının 2018 yılı güncellemesi

işleri yapılmıştır.






Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT PROJE NO	2018H033820-3
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Makine – Techizat Alımı
ALT PROJE TUTARI	2.450.000,00 TL
PALT ROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	2.450.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	4.971.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
ALT PROJE 2018 YILI HARCAMASI	4.924.051,43 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,06

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yıl içinde;



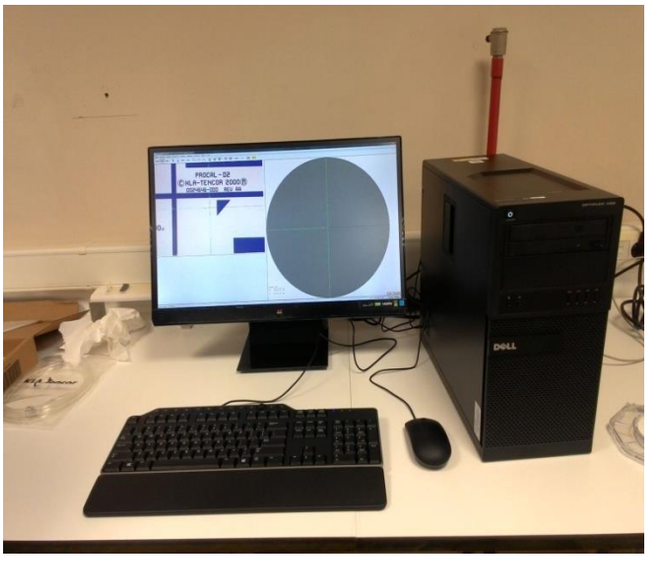

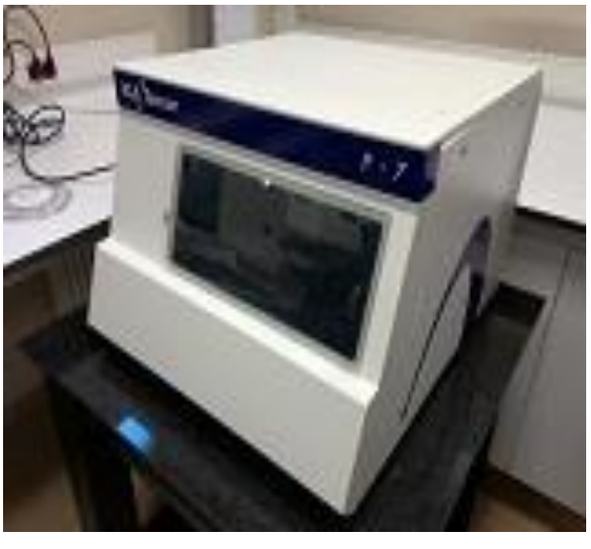



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Büro mefruşatı alımları için 475.445,50 TL, iş yeri mefruşat alımları için 48.436,00 TL, okul mefruşat alımları için 51.507,00 TL, diğer mefruşat alımları için 821.677,85 TL, büro makineleri alımları için 82.122,30 TL, bilgisayar alımları için 499.730,00 TL, tıbbi cihaz alımları için 13.098,00 TL, laboratuvar cihazı alımları için 2.349.097,08 TL, diğer makine teçhizat alımları için 562.110,70 TL, atölye gereçleri alımları için 20.827,00 TL olmak üzere Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 4.924.051,43 TL harcama yapılmıştır.

3.2.3. Yayın Alımı Projesi

RROJE NO	2017H03900
PROJE TUTARI	800.000,00 TL
PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	800.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2018-2018
2018 YILI HARCAMASI	780.496,54 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97,56

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2018 yılı için 800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 780.496,54 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %97,56 olarak gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında basılı yayın alımı için 34.698,79 TL, veri tabanı aboneliği alımı için 745.797,75 TL harcama yapılmıştır.





3.3. Kamulaştırma

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Spor Bilimleri Fakültesi ve 3.000 seyirci kapasiteli spor salonu işlerinin yapımına başlanabilmesi için ihtiyaç duyulan alanların bir kısmının kamulaştırması gerçekleştirilmiştir. Kamulaştırma için 2018 yılında 140.763 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Giresun Üniversitesinin etkin kaynak kullanımını zorlaştıran dağınık yapısı ve bulunduğu bölgenin coğrafi koşulları göz önüne alındığında özellikle Üniversitemize ait fiziki alanların oluşturulması ve genişletilmesi oldukça güçleşmektedir. Bu durum Üniversitemizde yeni binaların oluşturulması, mevcutların bakım-onarımının yapılması, gerekli çevre düzenlemeleri ve kampus alt yapı çalışmalarının kimi zaman süresi içinde bitirilememesine ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak;

- ✓ Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının Yatırım Programında belirtilen projeler için yıl içerisinde ihtiyaç duyulan zaman ve tutara göre hazırlandığı, dolayısıyla AFP tekliflerinin bu şekliyle dikkate alınması ve vize aşamasında mümkün olduğu kadar değişikliliğe gidilmemesi,
- ✓ Gelişmekte olan Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu fiziki altyapıyı tamamlayabilmesi için yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerektiği düşünülmektedir.

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda Üniversitemiz ilgili birimlerinin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personelin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

gibi hususların yatırım çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte, sürecin uzun olması sebebiyle de planlanan yatırımlar aksayabilmektedir. Bu yönde söz konusu sürelerin ihalelerin daha kısa zamanda sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi sonunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Üniversite gelişim alanı olarak belirlenen ancak bu zamana kadar kamulaştırma işlemleri tamamlanamayan yerler için ödenek tahsis edilerek kamulaştırma izni verilmesi yatırım projelerinin tamamlanması için önem arz etmektedir.

Ayrıca Kurumlarca; üniversitelerden yatırım projelerinin takibine yönelik yıl içerisinde birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, kimi zaman verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Yatırım izleme raporlarının tek bir sistem üzerinden güncellenmesi zaman kaybını önleyecek, raporlamanın etkinliğini, doğruluğunu artırarak projelerin takibini kolaylaştıracaktır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.035, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1201

5. 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		66.498			17.400			31.500			37.000			34.657
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	**6**		**66.498**			**17.400**			**31.500**			**37.000**			**34.657**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



HAZIRLAYANLAR

Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube Müdürü

Çiğdem KURUÇAY
Mali Hizmetler Uzmanı

Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
