GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GİRESUN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2020

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1

2. GENEL DEĞERLENDİRME 2

2.1. MİSYONUMUZ 2

2.2. VİZYONUMUZ 2

2.3. DEĞERLERİMİZ 2

2.4. İLKELERİMİZ 3

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ 3

2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLAR 5

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 8

2.8. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 15

3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI 17

3.1. DEVAM EDEN PROJELER 18

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 18

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi 19

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 19

3.2. TAMAMLANAN PROJELER 20

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 20

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi 20

3.2.3. Yayın Alımı Projesi 24

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 26

5. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 28

1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu'na 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 65'inci madde ile kurulan Giresun Üniversitesi 2019 yılı itibariyle 27186 öğrencisi, **1001** akademik ve **376** idari personeli ile 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 13 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 14 birim ve 21 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Üniversitemizin 2019 yılındaki yatırım projelerinde yer alan ödenekler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı bütçe uygulama tebliği hükümleri ile 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

Yatırım projelerinin izlenmesi ve yetkili mercilerce değerlendirilmesi gayesiyle; Üniversitemizce yürütülen yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren 2019 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanunun "Kamu Yatırım Projeleri" başlığını taşıyan 25'inci ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesi doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Üniversitemizin 2019 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Yılmaz CAN
Rektör

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.GENEL DEĞERLENDİRME

2.1.MİSYONUMUZ



Üniversitemizin misyonu, milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; kent, bölge ve ülkede toplumun ufkunu genişletmek, insanlığın ilerleyişine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaktır.

2.2.VİZYONUMUZ



Giresun Üniversitesi'nin vizyonu; bilgi ile güçlendirilmiş kaliteli eğitim veren, ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilen, eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslar arası öneme sahip bilgi limanı olmaktır.

2.3.DEĞERLERİMİZ

- Atatürkçülük
- Yurtseverlik
- Hukukun üstünlüğü
- Bilimsellik
- Katılımcılık
- Toplumsal yararlılık
- Güvenilirlik
- Sorumluluk
- Saydamlık

- Evrensellik
- Araştırmacılık
- Kalite ve verimlilik
- Fırsat eşitliği
- Çevre bilinci
- Hesap verebilirlik
- Özgürlü
- Çağdaşlık

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.4.İLKELERİMİZ

- Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek ve arttırmak
- Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek
- Başarıyı önemsemek
- Gelişime ve yeniliklere açık olmak
- Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek
- Ulusal kimliğe sahip çıkmak ve evrensel değerleri bağdaştırmak
- Kaynakları imkanlar dahilinde verimli şekilde kullanmak
- Adaletli bir yönetm politikası izlemek
- İçinde yaşanılan çevre ve topluma duyarlı olmak
- Kültürel ve ahlaki değerleri korumak

2.5. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Hedef 1.1: Akademik atama ve yükseltme kriterlerini düzenlemek

Hedef 1.2: Akademik ve İdari personel sayısın artırmak

Hedef 1.3: Çift anadal ve yandal diploması veren programlarını başlatmak

Hedef 1.4: Lisansüstü programlarının niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmek

Hedef 1.5: Eğitim-istihdam uyumlu programlar açmak

Hedef 1.6: Avrupa Yükseköğretim alanı için Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni (AKTS) tamamlamak

Hedef 1.7: Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetlerine ağırlık vermek

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Hedef 1.8: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemlerinden yararlanma oranını artırmak

Hedef 1.9: Uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamak

Stratejik Amaç 2: Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Hedef 2.1: Öğretim elemanlarının akademik yayınlarını bilişim teknolojileriyle erişilebilir hale getirmek.

Hedef 2.2: Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni akredite etmek.

Hedef 2.3: Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve projeleri desteklemek

Hedef 2.4: Kütüphanedeki bilgi kaynağı sayısını artırmak.

Hedef 2.5: Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlamak.

Stratejik Amaç 3: Fiziki Ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi

Hedef 3.1: Kurumsal gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet binalarını inşa etmek

Hedef 3.2: Fiziki yorgunluk görülen binaları bakım - onarım ve tadilatla güçlendirmek.

Hedef 3.3: Yerleşke alanlarında spor sahaları, kantin, kafeterya, yemekhane ve konferans salonu vb. inşaatları tamamlayarak faaliyete geçmelerini sağlamak.

Hedef 3.4: İhtiyaç duyulan alanların kamulaştırılmasını sağlamak

Hedef 3.5: Eğitim-öğretimi makine teçhizatla donatılmış mekanlarla desteklemek

Hedef 3.6: Mevcut Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (Hastane) binalarının hizmet için ihtiyaç duyduğu bakım onarımını yapmak ve makine-teçhizatla donatmak

Hedef 3.7: Bilişim sistemlerinin alt yapısını tamamlamak, entegre hale getirmek ve e-imzaya geçişi sağlamak.

Hedef 3.8: Üniversite olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini almak.

Stratejik Amaç 4: Uluslararasılaşmayı geliştirmek

Hedef 4.1: Uluslararasılaşmanın kurumsal altyapısını geliştirmek

Hedef 4.2: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının lisans ve lisansüstü düzeyinde artırılması.

Hedef 4.3: Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenci kalitesini artırmak

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Hedef 4.4: Akademik personelin uluslararası akademik faaliyetinin artırılması

Stratejik Amaç 5: Üniversite Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 5.1: Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaşatmaya yönelik bilimsel araştırma yapmak ve etkinlikler düzenlemek

Hedef 5.2: Sağlık konusunda bilgilendirici sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek.

Hedef 5.3: Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

Hedef 5.4: Sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak

Hedef 5.5: Toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.



2.6. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI

a) Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Gelirlerimiz :

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Sosyal tesis, kantin, vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri

5) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

b)Yasal Dayanaklar

2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46'ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayılabilir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.




Üniversitemiz 2019 yılında bütçe geliri olarak toplam 184818000,00 TL tahmin edilmiş, yıl içinde 20289603188 TL gelir elde edilmiştir.

2019 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL)

Açıklama	Planlanan Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.412.000,00	6.029.167,39	111,40
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	167.711.000,00	192.247.500,00	114,63
Diğer Gelirler	11.695.000,00	4.619.364,49	39,49
TOPLAM	**184.818.000,00**	**202.896.031,88**	**109,78**

Finansman Kaynaklarının Gerçekleşen Gelire Göre Dağılımı

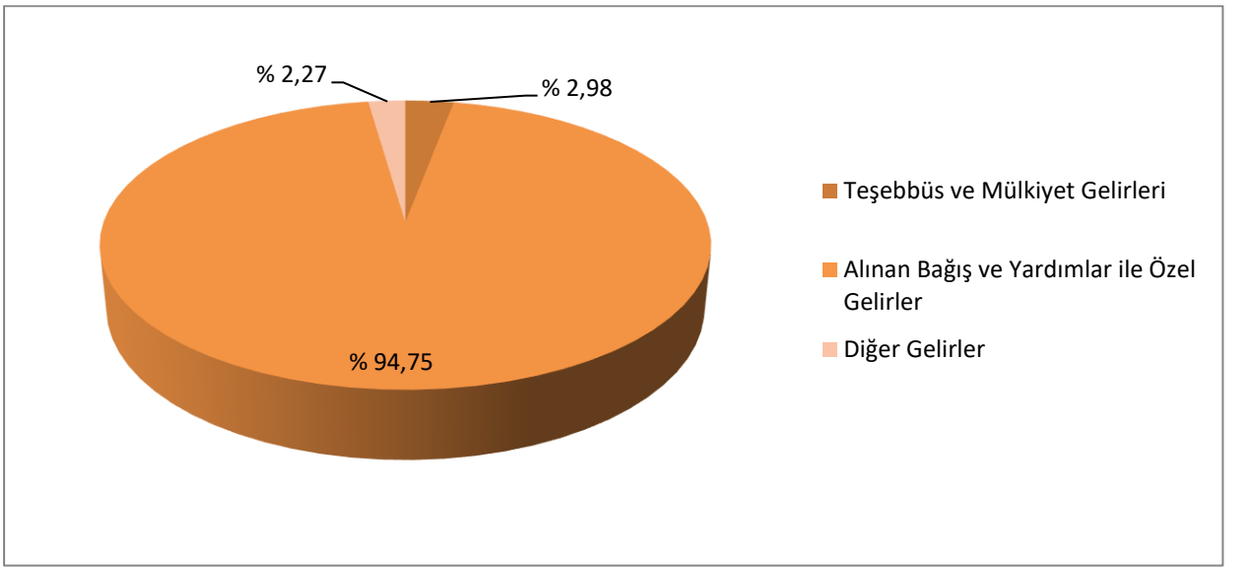

Bununla birlikte Üniversitemizin 2019 yılında bütçe geliri 184.818.000,00 TL olarak öngörülmüş, yıl içinde yapılan 18.078.031,88 TL ödenek eklenmesi sonucunda toplam ödenek 202.896.031,88 TL'ye ulaşmış ve bu ödenekle 195.357.826,38 TL harcama gerçekleşmiştir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Giresun Üniversitesi 2019 yıl sonu itibarıyla 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet Konservatuarı, 13 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 14 birim ve 21 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Giresun Üniversitesi Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkeleri merkezde konumlanmış olup ilçelerde farklı büyüklükteki yerleşkeleriyle 825.517,07 m^2 arazi yüzölçümü ve 186.523 m^2 yapı alanına sahiptir.



Kale Mevkiinde yer alan Merkez Rektörlük binası bünyesinde Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü ve Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü bulunmaktadır.
Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Rektörlük Ek Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, bölüm başkanlıkları, engelli öğrenci birimi, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRUMLAB) ile Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Araştırma Merkezi (TÖMER), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, AB Erasmus Ofisi, AR-Ge Koordinatörlüğü, personel ve öğrenci yemekhaneleri ile açık spor alanları, merkez kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir.



Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uygulama oteli (misafirhane), kapalı spor salonu, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Şehir merkezimizde bulunan bir diğer yerleşkemiz de Nizamiye yerleşkesidir. Üniversite Hastanesi ile Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nin afilasyon protokolü kapsamında birleşmesi sonucu poliklinik hizmetlerinin bir kısmı burada görülmektedir.

Alucra Turan BULUTÇU Meslek Yüksekokulu Alucra ilçemizde bulunmaktadır. Okulumuzun bünyesinde derslikler, bilgisayar laboratuarları, konferans salonu, toplantı salonu, sosyal alanlar ve kantin bulunmaktadır.

Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bulancak ilçemizde bulunmaktadır. Bulancak, nüfus itibariyle Giresun ilinin en büyük ilçesidir. Bulancak Kadir KARABAŞ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda ağırlıklı olarak Turizm sektörüne yönelik vasıflı eleman yetiştirilmektedir. Ayrıca bu ilçede konumlanacak olan Bulancak Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu 2017 yılında kurulmuştur.





Dereli Meslek Yüksekokulu Dereli ilçemizde, Espiye Meslek Yüksekokulu Espiye ilçemizde, Eynesil Kamil NALBANT Meslek Yüksekokulu Eynesil ilçemizde, Keşap Meslek Yüksekokulu ile Turizm Fakültesi ise Keşap ilçemizde konumlanmıştır.



Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Görele ilçesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Piraziz Meslek Yüksekokulu Piraziz ilçesinde yer almaktadır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Piraziz Meslek Yüksekokulu, Piraziz ilçesinde bulunmakta olup 20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı 2547 sayılı Yasa'nın 2880 sayılı Yasayla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır.

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar ilçe merkezinde yer almaktadır. Yerleşke bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır.

Tirebolu İletişim Fakültesi ile Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Bünyelerinde laboratuvarlar, konferans salonları, donanımlı teknoloji sınıfı ve kütüphane mevcuttur. Tirebolu Mehmet BAYRAK Meslek Yüksekokuluna bağlı bir bölüm Doğankent ilçemizde faaliyet göstermektedir.



Mevcut Alanların Dağılımı

	TOPLAM KULLANIM ALANI (m^2)
Rektörlük Binası(Şehir)	1809
Nizamiye Ön Blok	4604
Nizamiye Arka Blok	160
Gazipaşa A Blok	2-792
Gazipaşa B Blok	1474
Gazipaşa C Blok	5048
Gazipaşa MYO	1355
Gazipaşa Misafirhane/Uygulama Oteli	820
Gazipaşa Prefabrik (Tıp Fakültesi)	592
Gazipaşa Kapalı Spor Salonu	1176
Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	150
Gazipaşa Mobilya Atölye Depo	53
Gazipaşa Son Prefabrik	160

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Gazipaşa Mobilya İşlik (Depo)	115
Güre A-B-C Bloklar	5.360
Güre D-E Bloklar	4.250
Güre F-G-H Bloklar	5.280
Güre Rektörlük Hizmet Binası	6.056
Güre Yemekhane ve Sos.Tes.Binası	5.912
Güre Isı Merkezi	202
Güre Merkezi Laboratuvar	1.468
Güre Prefabrik (Spor Bilimleri Fakültesi)	416
Güre Lojmanlar	4.928
Ahmet Yılmaz Lojmanlar	2.094
Deney Hayvanları Laboratuvarı	259
Güre Kafeterya	191
Güre Amfi	885
Şelale	613
Sundurma Açık Otopark	240
Güre Personel Yemekhanesi	426
Spor Bilimleri Fakültesi (Prefabrik)	416
Spor Bilimleri Fakültesi	7.990
Diş Hekimliği Fakültesi - Turizm Fakültesi	468
Tirebolu İletişim Fakültesi	7.356
Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.950
Espiye MYO(MEB)	3.760
Espiye MYO(SYDV)	3.324
Şebinkarahisar UBYO	3.733
Bulancak UBYO	4.752
Görele UBYO	2.584
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	6.370
Alucra MYO	5.276
Şebinkarahisar MYO(Teknik)	5.270
Şebinkarahisar MYO(Sosyal)	2.720
Şebinkarahisar İşlik	732
Şebinkarahisar Fırın	217
Şebinkarahisar Kazan Dairesi	177
Şebinkarahisar Yemekhane	1.630
Tirebolu MBMYO	2.600
Çok Amaçlı Salon	1.164
Doğankent	5.226
Eynesil Kamil NALBANT MYO	4.089
Keşap MYO	1.675
Keşap Turizm Fakültesi	6.759
Dereli MYO	3.538
Sağlık Hizmetleri MYO	1.848
Sahil SET (Kafeterya)	203
Sahil SET (Rektörlük Konutu)	463
Sahil SET (Havuz)	200
Sahil SET (Apart Evler)	207
Sahil SET (Kreş)	459
Sahil SET (Lojman)	672
Fen-Edebiyat Fak. I.Kısım	44.134
Fen-Edebiyat Fak. II.Kısım	10.755
T O P L A M	**195.615**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2019 yılı sonu itibariyle Üniversitemizde 1.001 akademik, 376 idari toplam 1.377 personel bulunmaktadır. Üniversitemizde 2019 yılı sonu itibariyle akademik ve idari kadroların dağılımını gösterir tablolara aşağıda yer verilmiştir.

2019 YILI AKADEMİK PERSONEL SAYILARI			
	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	**Boş**	**Toplam**
Profesör	77	23	100
Doçent	88	39	127
Dr. Öğr. Üyesi	339	65	404
Öğretim Görevlisi	335	94	429
Araştırma Görevlisi	162	59	221
TOPLAM	**1001**	**280**	**1.281**

2019 YILI İDARİ PERSONEL SAYILARI					
Sınıflara Göre	**Kadroların Doluluk Oranına Göre**		**Cinsiyete Göre**		**Toplam**
	Dolu	**Boş**	**K**	**E**	
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	248	239	97	151	487
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	41	165	34	7	206
Teknik Hizmetler Sınıfı	58	57	8	50	115
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4	-	2	2	4
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	1	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	24	17	2	22	44
TOPLAM	**376**	**478**	**143**	**233**	**857**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

İdari personel sayısı içerisindeki en büyük payı % 65,95 ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı oluşturmaktadır. Ancak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dâhil, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Din Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki oranlar, Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile doğru orantı içersinde bir seyir izlememektedir.



2019 yılsonu itibariyle Üniversitemizde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplamı 27186'dır. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımını aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAKÜLTELER / KONSERVATUVAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Denizcilik Fakültesi	-	-	-	-	-
Diş Hekimliği Fakültesi	-	-	-	-	-
Eğitim Fakültesi	1.702	881	419	209	3.211
Fen Edebiyat Fakültesi	813	538	355	347	2.053
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi	104	82	-	-	186
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	566	794	279	543	2.182
İslami İlimler Fakültesi	344	160	235	171	910
Mühendislik Fakültesi	249	624	5	38	916
Sağlık Bilimleri Fakültesi	648	163	-	-	811
Spor Bilimleri Fakültesi	152	330	15	62	559
Tıp Fakültesi	211	203	-	-	414
Tirebolu İletişim Fakültesi	377	453	-	-	830
Turizm Fakültesi	5	21	-	-	26
Devlet Konservatuvarı	45	67			112
TOPLAM	**5.216**	**4.316**	**1.308**	**1.370**	**12.210**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

ENSTİTÜLER	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Fen Bilimleri Enstitüsü	212	221	-	-	433
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	37	51	-	-	88
Sosyal Bilimler Enstitüsü	461	485	-	-	946
TOPLAM	**710**	**757**	-	-	**1.467**

YÜKSEKOKULLAR	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Bulancak Kadir Karabaş Ubyo	163	419	47	124	753
Görele Ubyo	167	170	138	129	604
Şebinkarahisar Ubyo	216	85	146	111	558
Sivil Havacılık Ubyo	-	-	-	-	-
Yabancı Diller Yüksekokulu	-	-	-	-	-
TOPLAM	**546**	**674**	**331**	**364**	**1.915**

MESLEK YÜKSEKOKULLARI	I.ÖĞRETİM		II.ÖĞRETİM		TOPLAM
	KIZ	ERKEK	KIZ	ERKEK	
Alucra Turan Bulutçu MYO	288	279	27	47	641
Dereli MYO	148	151			299
Espiye MYO	309	353	157	356	1.175
Eynesil Kamil Nalbant MYO	520	96	465	52	1.133
Keşap MYO	179	186	38	63	466
Sağlık Hizmetleri MYO	836	332	354	206	1.728
Sosyal Bilimler MYO	568	618	221	330	1.737
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO	454	413	93	127	1.087
Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO	138	252	1	3	394
Teknik Bilimler MYO	412	966	169	551	2.098
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO	331	410	41	55	837
Bulancak Endüstriyel Sanatlar MYO	-	-	-	-	-
Piraziz MYO	-	-	-	-	-
TOPLAM	**4.183**	**4.056**	**1.566**	**1.790**	**11.595**
GENEL TOPLAM					**27.186**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

2.8. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI


Üniversitemizin 2019 yılı yatırımlarıyla ilgili bütçe tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 13.700.000,00 TL iken, 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5. maddesi uyarınca 8.331.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak Üniversitemiz yıl sonu sermaye ödeneği toplam 22.031.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 19.492.651,53 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğe oranı % 88,47'dir.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2019 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	2019 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2019 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)
Eğitim/Yükseköğretim	5	13.200.000,00	21.531.000,00	12.306.401,87	57,15
Eğitim/Beden Eğitimi Spor	1	500.000,00	500.000,00	486.998,98	97,39
TOPLAM	**6**	**13.700.000,00**	**22.031.000,00**	**12.793.400,85**	**58,06**

2019 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2019 YIL SONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	HARCAMA ORANI %
06.1	Mamul Mal Alımları	4.398.000,00	4.498.000,00	4.465.786,35	99,28
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	537.000,00	526.152,00	97,97
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.447.000,00	15.491.000,00	13.015.358,83	43,75
06.6	Bakım Onarım (Menkul)	100.000,00	100.000,00	98.767.02	98,76
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.255.000,00	1.405.000,00	1.386.587,74	98,68
TOPLAM		**13.700.000,00**	**22.031.000,00**	**19.492.651,53**	**60,16**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

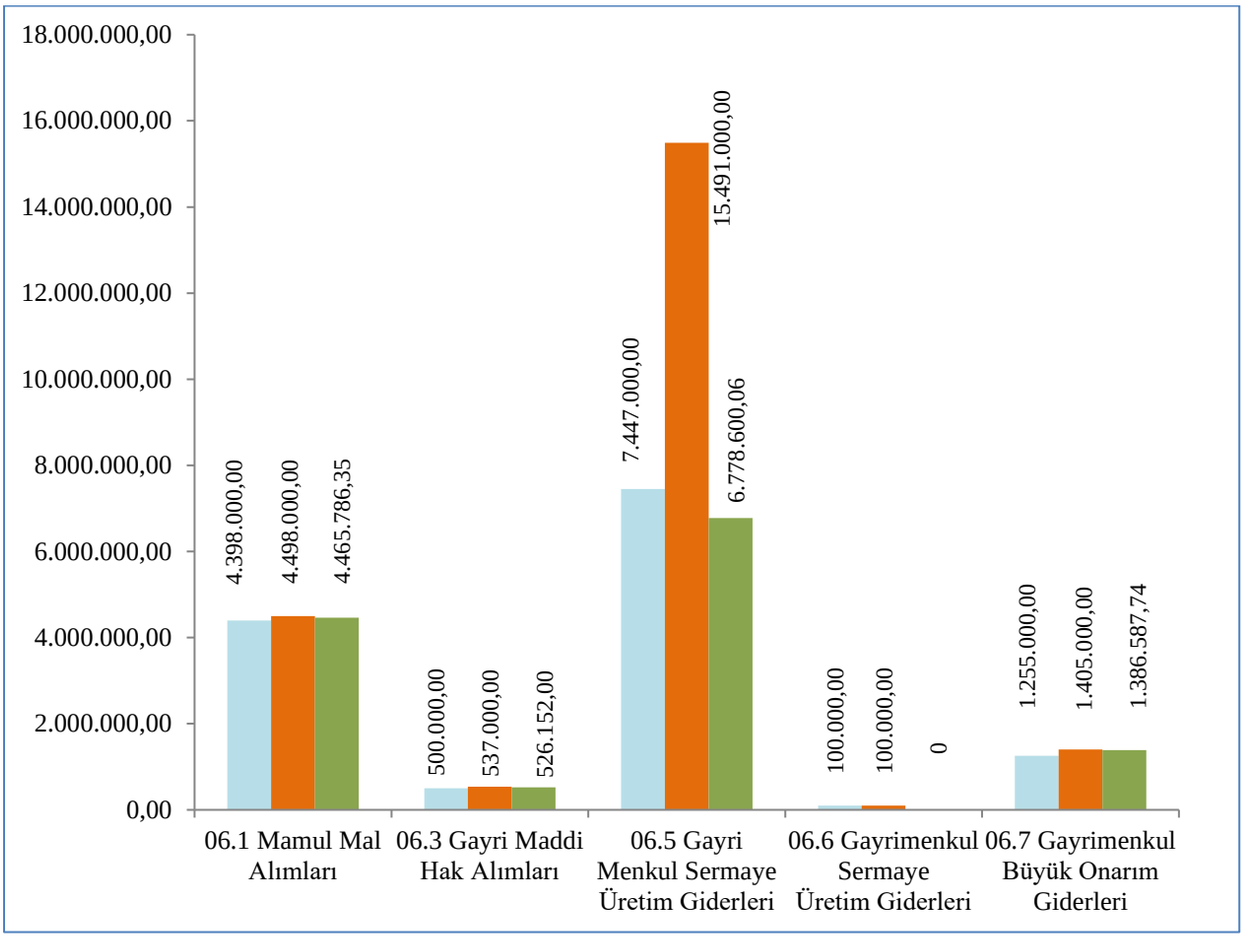

2019 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA TUTARLARI (TL)				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	**YIL SONU TOPLAM ÖDENEK**	**HARCAMA**	**GERÇEKLEŞME DURUMU %**
01-Personel Giderleri	133.443.000,00	134.335.025,00	134.229.954,41	99,92
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.223.000,00	19.503.885,00	19.325.136,53	99,08
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.352.000,00	18.941.553,00	18.611.983,45	98,26
05-Cari Transferler	4.100.000,00	4.188.500,00	3.698.100,46	88,29
06-Sermaye Giderleri	13.700.000,00	22.031.000,00	19.492.651,53	88,47
TOPLAM	**184.818.000,00**	**198.999.963,00**	**195.357.826,38**	**98,16**

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere başlangıç ödeneğinin % 7,41'ini, yıl sonu toplam ödeneğin % 11,07'sini, toplam harcamanın da % 9.97'sini sermaye giderleri oluşturmaktadır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.





3.2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemizi 2019 yılında yatırım programı kapsamında toplam 6 adet proje yürütmüştür. Bunlardan 5 adedi eğitim/yükseköğretim sektörüne, 1 adedi eğitim/beden eğitimi ve spor sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

PROJE NO	PROJE ADI	2019 YILI ÖDENEĞİ (TL)	REVİZELİ BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)	YIL SONU HARCAMA TUTARI (TL)
EĞİTİM SEKTÖRÜ		**13.700.000,00**		
2019H033690	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)	100.000,00	100.000,00	93.456,00
2008H032550	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	4.000.000,00	12.331.000,00	9.952.065,64
2008H032560	Kampüs Alt Yapısı (DOKAP)	3.200.000,00	2.913.000,00	2.826.382,13
2019H035740	Muhtelif İşler (DOKAP)	5.000.000,00	5.287.000,00	5.254.889,04
2010H050130	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)	500.000,00	500.000,00	486.998,98
2019H035760	Yayın Alımı (DOKAP)	900.000,00	900.000,00	878.859,75
GENEL TOPLAM		**13.700.000,00**	**22.031.000,00**	**19.492.651,53**

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

3.1. Devam Eden Projeler

3.1.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2008H032550
PROJE TUTARI	21.972.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	4.000.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	12.331.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Bilimleri Fakültesi (7.990 m^2)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2020
2019 YILI HARCAMASI	9.952.065,64
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%80,70

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2019 yılı için 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan ilavelerle proje ödeneği 12.331.000,00 TL' ye ulaşmıştır.

2008-2020 yıllarını kapsayan Projenin 2019 yıl sonu kümülatif harcaması 19.518.065,64 TL'dir. Bu proje detayına 2019 yılı için Spor Bilimleri Fakültesi (7.990 m^2) yapım işi alınmıştır.

Projenin 2019 yılsonu harcaması 9.952.065,64 TL olup harcamanın ödeneğe oranı % 80,70'tir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise %88,83'tür.

Derslik ve Merkezi birimler projesi dahilinde, Spor Bilimleri Fakültesi hizmetinde kullanılacak eğitim binasının yapımına devam edilmiştir.

* 2019 yılı yatırım programında kapalı alanı 7.990 m^2 olarak yer alan **Spor Bilimleri Fakültesi Binası** yapım işinin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanmış ancak yapım işi yüklenici firmadan kaynaklanan nedenlerle tamamlanamamıştır.



Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

3.1.2. Kampüs Alt Yapısı Projesi (DOKAP)

RROJE NO	**2008H032560**
PROJE TUTARI	23.609.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	3.200.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	2.913.000,00TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	D.Gaz Dön, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2008-2021
2019 YILI HARCAMASI	2.826.382,13TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	%97,02

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesine 2019 yılı itibariyle proje tutarı olarak 3.200.000,00 TL tahsis edilmiştir. Proje 2008-2021 yıllarını kapsamaktadır. Projenin 2019 yıl sonu kümülatif harcaması 18.735.382,13 TL'dir. Bu proje detayına 2019 yılı için doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işleri alınmış olup 2019 yıl sonu harcaması 2.826.382,13 TL'dir. Harcamanın ödeneğe oranı % 97,02'dir. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise % 79,35'tir.

Bu proje kapsamında; Güre yerleşkesinde çevre düzenleme işi, Üniversite birimlerinin telefon, elektrik, aydınlatma ve kompanzasyon tesisatlarının yenilenmesi, Üniversitemiz Güre ve Gazipaşa yerleşkesinde doğalgaz borularının döşenmesi ve muhtelif binaların ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi, fiber alt yapı yenilenmesi, rektörlük hizmet binası klima santrali bakımı ve arızalı kanal tipi aspiratörlerin onarımı vb. gerçekleştirilmiştir.

3.1.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DOKAP)

RROJE NO	**2010H050130**
PROJE TUTARI	8.998.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	500.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	500.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat- Spor Salonu (3000 Seyirci Kapasiteli)
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2010-2021
2019 YILI HARCAMASI	486.998,98 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 97,39

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2019 yılı itibariyle proje tutarı olarak 500.000,00 TL tahsis edilmiştir. Proje 2010-2021 yıllarını kapsamaktadır. Tahsis edilen ödenekten 486.998,98 TL Spor Bilimleri Fakültesi için spor mal/malzemesi alımı ihalesi yapılmıştır. Projenin bütünü itibarıyla nakdi gerçekleşme oranı ise %5,41 olup, ancak kamulaştırma işlemleri tamamlanamadığından projenin alt projesi olan 3.000 seyirci kapasiteli spor salonunun yapımına başlanamamıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

3.2. Tamamlanan Projeler

3.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

RROJE NO	**2019H033690**
PROJE TUTARI	100.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	100.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	100.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
2019 YILI HARCAMASI	93.456,00 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 93,45

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi'ne 2019 yılı itibariyle proje tutarı olarak 100.000,00 TL tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 2019 yıl sonu harcaması 93.456,00 TL'dir. Harcamanın ödeneğe oranı % 93,45'tir.

3.2.2. Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

RROJE NO	2019H035740
PROJE TUTARI	5.000.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	5.000.000,00 TL
REVİZELİ ÖDENEK	5.287.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
2019 YILI HARCAMASI	5.254.889,04 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,39

Muhtelif İşler (DOKAP) Projesi: Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt projeler kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir.

Proje tutarı olarak 5.000.000,00 TL tahsis edilmiş olup yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda projeye 287.000,00 TL ödenek ilavesi yapılarak revizeli proje ödeneği 5.287.000,00 TL olmuştur. Projenin 2019 yıl sonu harcaması 5.254.889,04 TL olup harcamanın ödeneğe oranı % 99,39'dur.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Bu proje kapsamında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT RROJE NO	2019H035740-1
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Büyük Onarım
ALT PROJE TUTARI	1.255.000,00 TL
ALT PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	1.255.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	1.405.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Gayrimenkul Büyük Onarım
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
ALT PROJE 2019 YILI HARCAMASI	1.386.587,74 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 98,68

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Gayrimenkul Büyük Onarım giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,

- Üniversitemizin Muhtelif Birimlerinde Yaptırılacak Bakım Onarım Faaliyetleri İçin Malzeme Alımı
- Güre Yerleşkesi'nde Bulunan Eğitim Fakültesi Binalarındaki Kullanılamaz Haldeki WC Kabin Kapılarının Değiştirilmesi ve 6 Adet Klozetin Montaj-Demontajı
- Tirebolu M.Y.O. ve İ.İ.B.F. ve Gazipaşa Yerleşkesi'nde PVC ve Alüminyum Doğramadan İmalatlar Yapılması
- Şebinkarahisar Teknik Bilimler M.Y.O. Binasında Tadilat ve İmalat İşleri
- Gazipaşa Yerleşkesi Tıp Fakültesinin Kullandığı A Blok Binası Dış Cephesinin Boya Yapılması
- Güre Yerleşkesi'nde Bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB) Binasının Muhtelif İmalat İşleri
- Güre Yerleşkesi Eğitim ve Hizmet Binaları Asansörlerinin Revizyonlarının Yapım
- Merkez Rektörlük Binası Çatısında Bakım Onarım Yapılması
- GRÜ Tabela İmalatları ve Tabela Bakım Onarımlarının Yaptırılması
- Gazipaşa Yerleşkesinde Buluna Binaların Çatı Onarımları ve Yerleşkedeki Tüm Çatı Oluklarının Temizlenmesi
- Öğrenci Yemekhanesi Girişine Sundurma Çatı Yapılması ve Çeşitli Birimlerde Muhtelif İmalatların Yapılması
- Üniversitemiz Dereli MYO'nun jenaratör onarımı
- Gazipaşa ve Güre Yerleşkesi'nde Bulunan Birimlerin Kırılmış Pencere ve Kapı Doğramalarının Değiştirilmesi ve Arızalı Kısımlarının Onarılması
- GRÜ Merkez Yerleşkesi Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı
- Güre Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın Kullandığı Binanın Zemin Katına Alüminyum Bölme İle Oda Yapılması

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

- GRÜ Sahil Sosyal Tesisleri Kazan Dairesinde Bulunan Temiz Su Kollektörleri ve Vanalarının Değişimi İle Belediye Temiz Su Hattının Yenilenmesi
- Tirebolu İletişim Fakültesi Güvenlik Kulübesi Enerji, Telefon ve Data Tesisatı Yapımı ve 100 Kva UPS Cihazının Akü Gruplarının Yenilenmesi
- Giresun Üniversitesi Merkez İlçede Bulunan 10 Adet Jeneratörün Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
- Giresun Üniversitesi Merkez İlçede Bulunan 8 Adet Güç Kaynağının Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
- Üniversitemiz Şebinkarahisar Teknik Bilimler M.Y.O. 10Kva UPS Cihazının Akü Gruplarının Yenilenmesi
- GRÜ Çeşitli Birimlerinde Bulunan Sirkülasyon Pompası ve Genleşme Tankları Bakım Onarımı
- Giresun Üniversitesi Muhtelif Elektrik Tesisatı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
- Güre Yerleşkesinde Bulunan Birimlerin Kullandıkları Binalarda Zamanla Oluşan Hasarların Giderilmesi
- Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Asansörünün Revizyon ve Onarımının Yapımı
- Eski Rektörlük Binası ve Çamlık Sosyal Eğitim Tesislerinde Bulunan B,C,D,E ve F Blok Bina Çatıları Gizli Derelerinin Temizlenmesi, Su Biriken Yerlerde Zemin Eğiminin Düzeltilmesi ve Derelere Tel Izgara Yapılması
- GRÜ Rektörlük Konutu Klima Bakımı ve Gazipaşa Yerleşkesinde Bulunan 4 Adet Klimanın Montaj/Demontaj ve Bakımı
- GRÜ Espiye Meslek Yüksekokulu Klima Montaj ve Tamiratı
- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Trafo Binası İle Çamlık Trafo Binası Bakım Onarımı
- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Binası Trafo Merkezi İle Rektörlük Binası Trafo Merkezi Bakım Onarımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT PROJE NO	2019H035740-2
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ALT PROJE TUTARI	500.000,00 TL
ALT PROJENİN 2018 YILI ÖDENEĞİ	500.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	537.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
ALT PROJE 2019 YILI HARCAMASI	526.151,59 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 97,97

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri giderlerine ilişkin olarak yıl içinde,

- Üniversitemiz web sayfasının yenilenmesi için gerekli olan modüllerin satın alınması
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi güncellenmesi (EBYS)
- Personel Otomasyon Yazılımı
- Öğrencilerle iletişim kurulması amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Sms alımı
- Logsign yazılım programının 2020 yılı güncellemesi
- Ünipa Otomasyon Sisteminin 2020 yılı güncellenmesi
- Üniversitemiz web sayfasının yenilenmesi için gerekli olan modüllerin satın alınması
- Uzaktan Eğitim Biriminin ihtiyacı olan yazılımların alımı
- Yordam Kütüphane Otomasyon Programının 2020 yılı güncellemesi
- e-Hak ediş yazılım programı (10 Kullanıcılı) ve e-Kiknet programının 2020 yılı güncellemesi işleri yapılmıştır.





İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler;

ALT PROJE NO	2019H035740-3
ALT PROJE ADI	Muhtelif İşler – Makine – Teçhizat Alımı
ALT PROJE TUTARI	3.000.000,00 TL
ALT PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	3.000.000,00 TL
ALT PROJE REVİZELİ ÖDENEK	3.100.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Makine-Teçhizat
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
ALT PROJE 2019 YILI HARCAMASI	3.099.927,62 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 99,99

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yıl içinde;









Büro mefruşatı alımları için 187.216,20 TL, diğer mefruşat alımları için 731.221,73 TL, büro makineleri alımları için 595.351,80 TL, laboratuvar cihazı alımları için 19.730,40 TL, diğer makine teçhizat alımları için 1.565.755,49 TL, laboratuvar gereçleri alımları için 1.652,00 TL olmak üzere Muhtelif İşler Projesi kapsamında toplam 3.099.927,62 TL harcama yapılmıştır.

3.2.3. Yayın Alımı Projesi

RROJE NO	2019H035760
PROJE TUTARI	900.000,00 TL
PROJENİN 2019 YILI ÖDENEĞİ	900.000,00 TL
SEKTÖRÜ	Eğitim/Yükseköğretim
YERİ	Giresun
KARAKTERİSTİĞİ	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	2019-2019
2019 YILI HARCAMASI	878.859,75 TL
DÖNEM NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI	% 97,65

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2019 yılı için 900.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 878.859,75 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %97,65 olarak gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında basılı yayın alımı için 24.951,37 TL, Elektronik Yayın Alımı için 853.908,38 TL harcama yapılmıştır.





Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

4. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemize; 18 Şubat 2019 Tarihli ve 30690 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de Yayımlanan 767 Sayılı 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Eki "2019 Yılı Yatırım Programı" ile altı adet kamu yatırım projesi tahsis edilmiştir. Eğitim Sektörü altında yer alan bu projelerin, beş tanesi Eğitim/Yükseköğretim bir tanesi, Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor alt sektörlerindedir. Eğitim/ Yükseköğretim alt sektöründe yer alan beş projenin üç tanesi yeni proje, iki tanesi yıllara sari, Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor alt sektöründeki bir proje ise yıllara sari olarak yürütülmüştür.

Bu projelerin uygulanması aşamasında karşılaşılan temel sorunlar ve çözüme yönelik önerilerimiz aşağıda belirtilmektedir;

Üniversitemizce yıllara sari olarak yürütülen ve 2019 yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olan **2008H032550 nolu Derslik ve Merkezi Birimler** projesinde karşılaşılan sorun, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vizelenen ve 7156 sayılı 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen 11.600.000,00 TL ödeneğe karşılık, 767 Sayılı Kararla yayımlanan 2019 Yılı Yatırım Programında projeye 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmesi ve bu durumdan kaynaklanan ödenek yetersizliği olmuştur.

Yıllara sari yürütülen, 2019 yılı ödeneği 3.200.000,00 TL **2008H032560 nolu Kampüs Altyapısı** projesi, yıllık olarak programda yer alan projelerden ödeneği 100.000,00 TL olan, **2019H033690 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi** ile ödeneği 900.000,00 TL olan **2019H035760 nolu Yayın Alımı Projesi** sorunsuz olarak yürütülmüştür.

Bununla birlikte yeni yıllık proje olarak 5.000.000,00 TL başlangıç ödenekli, **2019H035740 nolu Muhtelif İşler** Projesi detayında yürütülen, 2019H035740-2 nolu Makine Teçhizat Alımları alt projesinden, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereği "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar" kapsamında Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde ihtiyaç duyulan makine teçhizatın tamamı ödenek yetersizliğinden satın alınamamıştır. Çok yerleşkeli yerleşim düzeni, topografya ve iklim yapısı, yaşlı ve yorgun binaların olması Üniversitemizin bina bakım onarım giderlerini artıran faktörlerdir. Bakım Onarım alt projesi kapsamında yürütülen bina bakım onarımları 150.000,00 TL ek ödenek ilavesiyle tamamlanmış, makine bakım onarımları mevcut ödenekler dahilinde sorunsuz yapılmıştır.

Yıllara sari olarak, 2010H050130 nolu Açık ve Kapalı Projesi kapsamında yürütülen makine teçhizat alt projesi sorunsuz bir şekilde yürütülürken, Spor Salonu alt projesinde arazi kamulaştırma işlemleri tamamlanamamıştır. Bu sorun nedeniyle, Dünyanın ve Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 27.186 öğrencinin buluştuğu Giresun Üniversitesine, tavan yüksekliği uluslararası standartlarda olan bir spor salonu kazandırılamamıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

Bu bağlamda,
Yatırım programına alınacak projelerin, kurum teklifine göre belirlenmesi,

Yatırım programına alınan proje ödeneklerinin, Bütçe Kanununda vizelenen ödeneklere göre belirlenmesi.

Proje Ödeneklerinin artırılması,
Muhtelif işler projesi kapsamında ödenek tahsis edilirken "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Eğitim ve Öğretimin Sürdürülmesi İçin Gerekli Asgari Koşullar"ın ve Engellilerin Erişebilirliği Projesinin göz önüne alınması,

Yatırım Programı kapsamında Ar-Ge projesi olarak yapımı tamamlanan ve eğitim- öğretim süreçlerinde yoğunlukla yükseklisans-doktora aşamalarında yararlanılan Merkezi Araştırma Laboratuvarları için Ar-Ge sektöründen muhtelif işler projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi,

Yatırımlarla ilgili tüm süreçlerin Ka-Ya sisteminden takip edilmesi, bu süreçlerle ilgili bilgi ihtiyacı olan kamu kurumlarının Ka-Ya sisteminden bu bilgileri alabileceği bir mekanizmanın oluşturulması,

AFP dağılımlarının serbest ödeneklerinin son aylara bırakılmaması ödenek dağılımlarının kurum teklifine göre yapılması,

önerilmektedir.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-RPR.036, R00, 19.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1202

5. 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		60.579			34.657			13.700			22.031			19.493
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	**6**		60.579			34.657			**13.700**			22.031			19.493

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



HAZIRLAYANLAR

Ayşegül OKSAL
Bütçe ve Performans Şube Müdürü

Çiğdem KURUÇAY
Mali Hizmetler Uzmanı

Arzu ALTAY
Bilgisayar İşletmeni

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
